2017年下半年案例分析

【2017 年 11 月试题一】

A 公司承接了一个为某政府客户开发 ERP 软件的项目，任命小张担任项目经理。由于该客户与 A 公司每年有上千万元的项目合作，A 公司管理层对该客户非常重视，并一再嘱咐小张要保证项目的客户满意度。为此，小张从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团队。

在项目初期，小张制定了变更和配置管理规则：客户需求发生变化时，应首先由工程师对需求变化造成的影响做评估，如果影响不大，工程师可以直接进行修改并更新版本，不需要上报项目经理：当工程师不能判断需求变化对项目的影响时，应上报给项目经理，由项目经理作出评估，并安排相关人员进行修改。

在项目实施过程中，用户针对软件的功能模块提出一些修改需求，工程师针对需求做了评估，发现修改工作量不大，对项目进度没有影响，因此，出于客户满意度的考虑，工程师直接接受了客户的要求，对软件进行修改。在软件测试联调阶段，测试人员发现部分功能模块与原先设计不符，造成很多接口问题。经调查发现，主要原因是客户针对这些功能模块提出过修改要求，项目经理要求查验，没有发现相关变更文件。

【问题 1】（10 分）

请分析该项目实施过程中存在哪些主要问题。

【问题 2】（10 分）

结合案例，请描述项目变更管理的主要工作程序。

【问题 3】（6 分）

请将下面（1）～（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

根据变更的迫切性，变更可分为（1）和（2），通过不同流程处理。变更管理过程涉及到的角色主要包括项目经理、（3）、（4）、（5）、（6）。

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

（1）小张制定的变更和配置管理规则存在问题，没有按照变更控制流程制定变更管理规则。

（2）客户需求发生变化时，首先由工程师对需求变化造成的影响做评估存在问题，应该由项目经理对影响进行评估。

（3）项目经理作出评估，并安排相关人员进行修改存在问题，没有成立变更控制委员会（CCB），项目变更决策需要由 CCB 做出并分派实施。

（4）工程师直接接受了客户的要求，对软件进行修改存在问题，应该由项目经理接受申请，并由 CCB 作出是否变更的决策

（5）项目变更后投有通知相关干系人存在问题。导致测试人员发现接口问题

（6）变更没有产生相关的变更文档。

【问题 2】（10 分）

（1）提出与接受变更申请

（2）对变更的初审

（3）变更方案论证

（4）项目管理委员会审查

（5）发出变更通知并组织实施

（6）变更实施的监控

（7）变更效果的评估
（8）判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道
【问题 3】（6 分）
（1）紧急变更 （2）非紧急变更 （3）变更控制委员会
（4）变更申请人 （5）变更实施人 （6）配置管理员

【2017 年 11 月试题二】
某信息系统项目包含 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 十个活动,各活动的历时、成本估算值。活动逻辑关系如下表所示:

活动名称	活动历时(天)	成本估算值（元）	紧前活动
A	2	2000	---
B	4	3000	A
C	6	5000	B
D	4	3000	A
E	3	2000	D
F	2	2000	A
G	2	2000	F
H	3	3000	E、G
I	2	2000	C、H
J	3	3000	I

【问题 1】（10 分）
（1）计算活动 H、G 的总浮动时间和自由浮动时间
（2）指出该项目的关键路径
（3）计算该项目的总工期
【问题 2】（3 分）
●项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计,发现活动 C 完成了 50%,活动 E 完成了 50%,活动 G 完成了 100%,请判断该项目工期是否受到影响？为什么？
【问题 3】（10 分）
●结合问题 2,项目经理在第 9 天结束对项目成本进行了估算,发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元,活动 D 的实际花费比预估少了 500 元,活动 C 的实际花费为 2000 元,活动 E 的实际花费为 1000 元,其他活动的实际花费与预估一致；
（1）请计算该项目的完工预算 BAC；
（2）请计算该时点计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI;
【问题 4】（3 分）
●项目经理对进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析,并制定了改进措施,假设该改进措施是有效的,能确保项目后续过程中不会再发生类似问题,请计算该项目的完工估算 EAC；

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

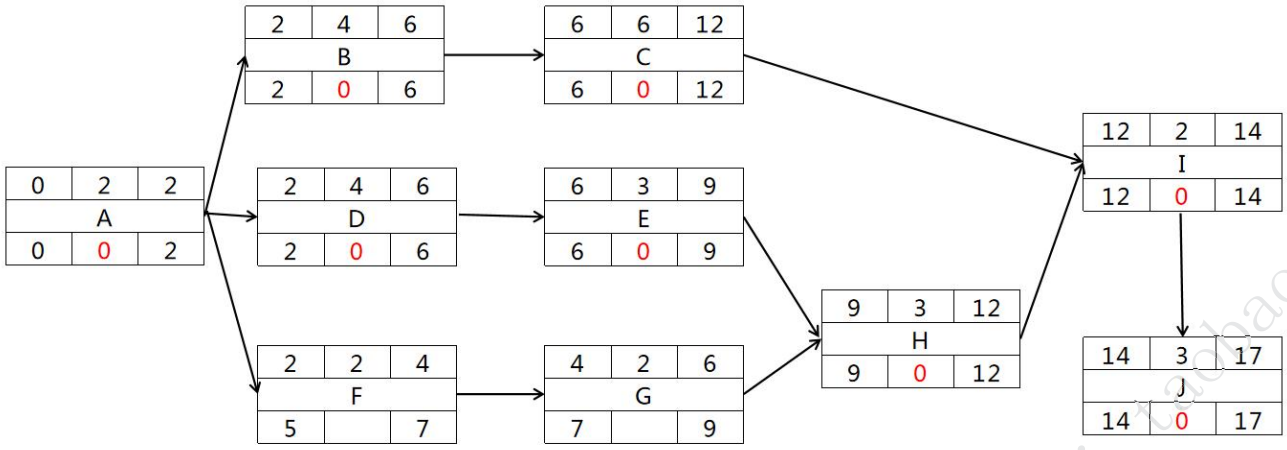

【答案】

【问题 1】（10 分）

（1）H 的总时差为 0（1 分）,自由时差为 0（1 分）

G 的总时差为 3（1 分）,自由时差为 3（1 分）

（2）关键路径为 ADEHIJ（2 分）和 ABCIJ（2 分）

（3）总工期为 17 天（2 分）

【问题 2】（3 分）

项目工期会受到影响（1 分）因为按计划 E 要完成 100%,而现在只完成了 50%（1 分）,而 E 活动又是关键活动,延期了将影响工期（1 分）。

【问题 3】（10 分）

（1）BAC=2000+3000+5000+3000+2000+2000+2000+3000+2000+3000=27000 元（2 分）

（2）PV=A+B+C*50%+D+E+F+G=2000+3000+2500+3000+2000+2000+2000=16500 元（2 分）

EV=A+B+C*50%+D+E*50%+F+G=2000+3000+2500+3000+1000+2000+2000=15500 元（2 分）

- AC=2000+4000+2000+2500+1000+2000+2000=15500 元（2 分）
- CPI=EV/AC=15500/15500=1（2 分）
- SPI=EV/PV=15500/16500=0.94（2 分）

【问题 4】（3 分）采用非典型偏差公式计算（1 分）

EAC=AC+ETC=15500+（27000-15500）=27000 元（2 分）

【2017 年 11 月试题三】

甲公司中标一个城市轨道交通监控系统开发项目，公司领导决定启用新的技术骨干作为项目经理，任命研发部软件开发骨干小王为该项目的项目经理。

小王技术能力强，自己承担了该项目核心模块开发任务，自从项目管理计划发布以后，一直投身于自己的研发任务当中。除了项目阶段验收会之外，没有召开过任何项目例会，只是在项目出现问题时才召开项目临时会议。经过项目团队共同努力，该项目进展到系统测试阶段。在系统测试前，发现该项目有一个指示灯显示模块开发进度严重滞后，小王立刻会同该模块负责人小李一起熬夜加班赶工，完成了该模块。

小王在项目绩效考核时，认为小李的工作态度不认真，给予较差评价并在项目团队内公布考核结果。小李认为自己连续熬夜加班，认为也已完成，觉得考核结果不公平，两人就此问题发生了严重冲突，小李因此消极怠工，甚至影响到了项目验收。

【问题 1】（11 分）

（1）基于以上案例，请指出小王在项目团队管理和沟通管理过程中的不恰当之处。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

（2）针对小李在项目中的问题，请说明小王该如何预防和改进。
【问题 2】（4 分）
结合案例，说明项目经理小王应当重点学习哪些项目团队管理的方法？
【问题 3】（2 分）
结合案例中小王和小李的冲突，请指出他们之间的冲突属于_____（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填
入答题纸对于栏内）。
A.项目优先级冲突
B.资源冲突
C.个人冲突
D.技术冲突
【问题 4】（6 分）
请简要描述项目冲突管理的方法

【参考答案】
【问题 1】（11 分）
1、基于以上案例，请指出小王在项目团队管理和沟通管理过程中的不恰当之处。
（1）小王缺乏项目管理理论和经验，项目管理能力不足
（2）小王工作重点一直在自己的研发任务中存在问题，项目经理应该以项目管理为主要工作。
（3）小王没有按计划召开项目例会存在问题，应该按项目管理计划进行例会。
（4）小王对进度检查，测试前才发现指示灯模块进度严重滞后。
（5）小王在沟通与小李的沟通过程中存在问题，没有及时把自己的想法与小李沟通，没有给小李解释的机会；
（6）小王处理冲突的方法存在问题，导致小李消极怠工。
（7）小王在沟通方面应读先和小李进行非正式的沟通，了解进度延误的原因。如果进度延误的原因是因为小李的工作态度问题导致的，应该明确指出，并要求改正。如果是其它非小李可控原因，应该和小李一起寻求解决办法。而不是直接公布考核结果。
2、针对小李在项目中的问题，请说明小王该如何预防和改进。
（1）跟踪个人和团队的执行情况、提供反馈
（2）提高项目的绩效、保证项目的进度
（3）管理冲突、解决问题
（4）评估团队成员的绩效
（5）提高沟通交流能力
（6）掌握一些人际关系技能
【问题 2】（4 分）
（1）观察与交谈
（2）项目绩效评估
（3）冲突管理
（4）人际关系技能
【问题 3】（2 分）
C
【问题 4】（6 分）
（1）撤退/回避：就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

（2）缓和/包容：就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。
（3）妥协/调解：就是冲突各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意、但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决办法。
（4）强迫/命令：就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。一般只适用于赢——输这样的零和游戏情景里。
（5）合作/解决问题：综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开发式对话引导各方达成共识和承诺。这是冲突双方最理想的结果，前提是双方要互相尊重、愿意合作、愿意倾听对方。

淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com
微信公众号：野人老师
