2019年上半年案例分析

【2019 年 5 月试题一】

A 公司中标某金融机构甲方位于北京的数据中心运行维护项目，并签署了运维合同。合同明确了运维对象包括服务器，存储及网络等设备，并约定：核心系统备件四小时到场；非核心系统备件 24 小时到场；80%以上备件需满足上述时效承诺，否则视为违约。

A 公司任命小张担任该项目的项目经理，为了确保满足服务承诺，小张在北京建立了备件库，招聘了专职备件管理员及库房管理员，考虑到备件成本较高，无法将服务器、存储和网络设备的所有备件都进行储备，备件管理员选择了一些价格较低的备件列入《备件采购清单》，并经小张批准后交给了采购部。随后，采购部通过网站搜索发现 B 公司能够提供项目所需全部备件且价格较低，于是确定 B 公司作为备件供应商并签署了备件采购合同。

项目实施三个月后，甲方向公司投诉，一是部分核心系统备件未能按时到场，二是部分备件加电异常，虽然补发了备件，但是影响了系统正常运行。针对备件未能按时到场的问题，小张通过现场工程师了解到：一是部分核心系统备件没有储备；二是部分备件在库存信息中显示有库存，但调取时却找不到。为此需要临时从 B 公司采购，延误了备件到场时间。

针对备件加电异常的问题，小张召集采购部、库房管理员、B 公司召开沟通会议，库房管理员认为 B 公司提供的备件质量存在严重问题，但无法提供相应证据。B 公司则认为，供货没有问题，是库房环境问题导致备件异常，因为 B 公司人员送备件到库房时曾多次发现库房温度、湿度超标。采购部人员观点与库房管理员一致，原因是采购部通过查询政府采购网等多家网站发现，B 公司去年存在多项失信行为记录，大家各执一词，会议无法达成共识。

【问题 1】（5 分）

请说明采购管理的主要步骤。

【问题 2】（12 分）

结合案例，请指出，该项目采购管理中存在的问题。

【问题 3】（3 分）

请简述采购货物入库的三个条件。

【问题 4】（7 分）

请将下面（1）~（7）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

供应商选择的三大主要因素是供应商的（1）、（2）、和（3）。经进货验证确定为不合格的产品，应采取的处理包括退货、（4）和（5）。采购需求通常包括标的物的配置、性能、数量、服务等，其中（6）和（7）最为关键。

【参考答案】

【问题 1】（5 分）

（1）需求确定与采购计划的制订　（买一本高项书）
（2）供应商的搜寻与分析　（淘宝、京东、当当、拼多多在哪买）
（3）定价：竞争性报价和谈判　（看价格）
（4）拟定并发出定单　（下单购买）
（5）定单的跟踪和跟催　（发货进度跟踪）
（6）验货和收货　（验货和收货 ）
（7）开票和支付货款　（货到付款 ）
（8）记录管理　（做个记录 ）

【问题 2】（12 分）

（1）没有做好规划采购工作，未制定合理的采购管理计划、供方选择标准等。
（2）没有没有编写采购工作说明书，未提前列明采购货物的质量等级、标准要求等。
（3）在实施采购过程中，仅凭价格低就选择卖方，未综合评价卖方综合情况，采购流程制度不规范。
（4）采购过程项目经理未重视采购管理，未说明采购备件的要求和参与采购过程监管。
（5）未将项目的进度与采购货物的时间进行综合考虑。
（6）库存规划不合理，未储备采购核心系统备件
（7）库存管理混乱，库存信息未能反映真实情况。
（8）仓库环境可能存在问题，这样会导致仓库中的备件被损毁。.
（9）未及时做好货物验收工作，进入现场才被甲方发现备件加电异常。
（10）未做好控制采购工作，应及时监控卖方绩效，有问题要及时纠偏，而不是等到临近交货或交货时才发现问题。
（11）未记录好采购过程中的相关采购文档和往来凭证，出问题难以找证据。
（12）可能未在合同中规定交付验收标准、要求，或规定不合理，导致各种争议。
（13）合同中未规定索赔和违约条款，无法进行有效合同管理
（14）沟通存在问题，应充分做好会前准备工作，做好会议引导。
【问题 3】（3 分）
请简述采购货物入库的三个条件。
（1）采购产品验证完毕后，检验合格的产品，《进货检验记录单》作为办理入库的条件之一。
（2）库房核对采购设备对应项目准确无误，作为办理入库条件之二。
（3）供应商提供的运货单或者到货证明，作为办理入库条件之三。
【问题 4】（7 分）
（1）产品价格（2）质量（3）服务；（4）调换（5）降级改作他用（需主管领导批准，并在相关部门备案）（6）配置（7）性能

【2019 年 5 月试题二】
某公司承接了一个软件外包项目，项目内容包括 A.B 两个模块的开发测试。项目经理创建了项目的 WBS（见下表），估算了资源、工期，项目人力资源成本是 1000 元/人・天。

活动	人数安排	预计工作量（人・天）
模块A开发	8	48
模块A单元测试	1	4
模块A修复	8	8
模块A回归测试	1	3
模块B开发	8	80
模块B单元测试	1	3
模块B修复	10	10
模块B回归测试	1	2
A、B接口测试	1	2
A、B联调	2	4

【问题 1】7 分
根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。
【问题 2】 10 分
项目开展 11 天后，阶段评审发现：模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试工作还没有开始：

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。
（1）请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV，并评价项目目前的进度和成本绩效。
（2）按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC（写出计算过程，计算结果精确到个位）。
【问题 3】 6 分
基于问题二，针对项目目前的绩效，项目经理应采取哪种措施保证项目按时完工？

【答案】
【问题 1】

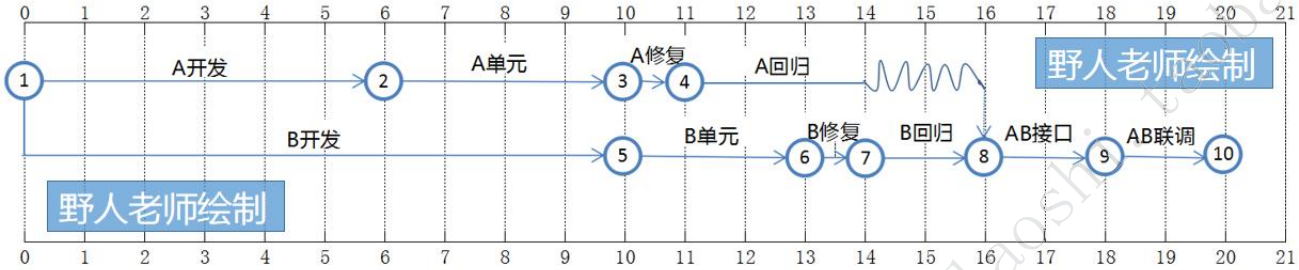

【野人老师点评】
2019 上半年信息系统项目管理师案例，需要画时标网络图，这是从 05 年开考以来，重来没有过的事情，第一次考。可以说，这个题目，很多的考生都不会。
【问题 2】
（1）到第 11 天后，按照计划的话 A 开发、 A 单元测试，A 修复，B 开发做完，B 单元测试做了 1/3。但是实际完成了 A 开发，A 单元测试，A 修复做了 1/2，B 开发完成所以 PV=（48+4+8+80+3*1/3）*1000 =141000
EV = （48+4+4+80）*1000=136000 AC = 180000
CV = EV－AC = 136000－180000= -44000
SV = EV－PV = 136000－141000 = -5000
所以进度落后，成本超支。
（2）PV=141000 EV =136000 AC =180000
CPI=EV/AC=136000/180000 = 136/180
BAC=（48+4+8+3+80+3+10+2+2+4）*1000=164000
ETC=（BAC-EV）/CPI =（164000 -136000）* 180/136 =28000 * 180/136= 37059 （ 约等于 37058.8，题目说需要精确到个位）
【问题 3】
（1）用高效人员代替低效人员
（2）加班或赶工在预防风险的情况下并行施工
（3）提高资源利用率
（4）加强、改进沟通，提高效率
（5）尽可能一次性把事情做对，减少返工
（6）加强沟通
（7）增强优质资源
（8）外包和缩小项目范围

【2019 年 5 月试题三】
2018 年 7 月某信息系统公司中标当地司法部门语音转写项目，任命小陈为项目经理。小

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

陈组建了项目组，制定了项目范围说明书，并获得了客户确认。为了激励成员，小陈向公司申请了项目奖金。项目进行过程中，小陈发现人员紧张，请来在读研究生小张协助软件研发工作，并对其进行了培训。项目组成员如下：

序号	姓名	职责	备注
1	小陈	项目经理	技术能力强，具有多年研发经验
2	小胡	软件架构设计	多年软件研发工作经验，责任心强，积极热情，希望承担更多工作
3	小万	软件工程师	多年软件研发工作经验，单身，需要更多认同感
4	小张	软件工程师	在读研究生，勤工俭学
5	小李	算法工程师	业内专家，收入高，喜欢享受生活
6	小王	界面美工设计	刚毕业大学生，希望多从项目中学到一些东西，并在公司立足

软件开发完成后，小陈找到公司办公室职员小侯帮助进行软件测试。小侯普通话不标准，测试发现语音识别率不高，小李认为原因是程序架构不合理，小胡则认为是算法存在问题，双方争论不休。小陈认为这是正常的工作状态，未作干预。项目组成员间气氛日趋紧张，士气低落。

【问题 1】（6 分）

请结合项目范围管理和人力资源管理知识，总结项目经理在该项目中做得恰当与不恰当的地方。

【问题 2】（10 分）

如果你是项目经理，请分析表中的其他项目成员处于马斯洛需求层次理论的哪一层，并给出相应的激励措施。

【问题 3】（5 分）

请简述团队成员发生冲突后，有哪些冲突解决办法?

【问题 4】（4 分）

在人力资源管理工具中，属于 X 理论的有（ ）（将选项编号填入答题纸对应栏内）。

A.人们天生反对改革

B.在适当的条件下，人们愿意主动承担责任

C.工作动机就是为了获得经济报酬

D.人生来就以自我为中心

E、人们能够做我确定目标、自我指挥、自我控制

F、注重满足员工的生理需求和安全需求

G、大多数人具有一定的想象力和创造力

【参考答案】

【问题 1】（6 分）

恰当地方：

（1）制定项目范围说明书

（2）并得到了客户的确认

（3）申请项目奖金用于团队成员激励。

（4）对团队成员进行了培训。

（5）项目开发完成后进行了范围确认、项目测试。

不恰当地方：

（1）团队成员冲突没有进行处理。

（2）没有进行项目团队建设，团队士气低落。
（3）范围确认标准不清晰。
（4）没有专职的测试人员
【问题 2】（10 分）
如果你是项目经理，请分析表中的其他项目成员处于马斯洛需求层次理论的哪一层，并给出相应的激励措施。

序号	姓名	需求层次	备注
1	小胡	受尊重	荣誉性的奖励，形象、地位的提升，颁发奖章，作为导师培训别人
2	小万	社交需求	定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等
3	小张	生理需求	员工宿舍、工作餐、工作服、班车、工资、补贴、奖金
4	小李	自我实现	让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与公司的管理会议等。
5	小王	安全需求	养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等。

【问题 3】（5 分）
（1）合作/解决问题 （2）强迫/命令 （3）妥协/调解 （4）缓和/包容 （5）撤退/回避
【问题 4】（4 分）
A C D F

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com
