2024年上半年案例分析试题和试题解析（5月26日第2批）

（由于机考后没有真题，题目为野人老师根据学员回忆的考试内容）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

2024年上半年（第2批次）案例分析试题和试题解析

【2024 年 5 月（第 2 批次）试题一】

某海关拟建设电子人工智能平台，采用光学字符识别技术（OCR），将多语种报关单、身份证件等文件转为电子文档，以提高报关效率。

项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目目的、项目目标（60 天内提高报关效率）、项目描述、项目边界定义、项目退出标准、拟申请的财务资源、关键用户名单、项目审批要求、项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准后，小张组建了项目团队。

电子订单人工智能平台的建设主要包括六个工作模块，内容和特点如下：

（1）平台硬件交付：包括人工智能服务器、网络、高拍仪等的采购、搭建、测试等，需求明确、建设方法成熟、要求训练数据到位前交付。

（2）数据采集和标注：要求数据小组一次性交付 50 万张相关报关单及身份证件图片及标注结果。

（3）OCR 模型调试：要求数据小组多次调试并交付模型，精度不断提高，直到实现关务部门认可的效果和性能。

（4）OCR 算法开发：创新程度高，团队没有同类项目开发经验，3 天就需要更新一次，确保开发方向正确。

（5）前端界面开发：需要展示界面风格，操作步骤多次向关务部门进行演示，尝试用各种选项澄清范围和需求，在最后完成可接受的全部功能。

（6）平台操作测试：平台边研发边上线，完成一个功能模块就需要向相关人员提供一次操作或维护培训，在最后一次培训结束后才算完成全部工作。

项目验收时，海关技术的负责人、关务部门代表首次受邀参与项目，在验收评审会中指出了诸多问题，包括平台关键功能不完整、项目计划不合理、算法精度差、识别速度慢等，表示不认可交付成果。

【问题 1】（6 分）

结合项目案例，请指出项目章程的内容存在哪些缺陷？

【问题 2】（6 分）

结合项目案例，请帮助小张为六个工作模块选择最适合的开发方法。

A. 预测型方法

B. 迭代型方法

C. 增量型方法

D.敏捷型方法
（1）平台硬件交付（ ）
（2）数据采集和标注（ ）
（3）OCR 模型调试（ ）
（4）OCR 算法开发（ ）
（5）前端界面开发（ ）
（6）平台操作测试（ ）
【问题 3】（7 分）
（1）结合项目案例，请指出小张应让相关干系人参与哪些项目工作，以避免验收阶段出现的问题。
（2）有效执行干系人绩效域可以实现哪些预期目标？
【问题 4】（6 分）
结合案例，判断下列说法的正误（填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。
（1）变更请求必须经过 CCB 的审批。（）
（2）CCB 应负责提出合理、可执行的变更方案。（）
（3）CCB 由主要干系人共同组成，包括用户单位的关务部门代表人员。（）
（4）批准的变更请求不应导致项目管理计划的更新。（）
（5）CCB 是项目的所有者权益代表。（）
（6）CCB 是作业机构，不是决策机构。（）

【参考答案】
【问题 1】（6 分）
本项目章程的内容存在的问题:
（1）项目的目标定义不够清晰，应是可测量的目标
（2）没有明确高层级的需求以及主要的可交付成果
（3）没有明确整体项目风险;
（4）没有明确总体里程碑进度计划
（5）应该是预先批准的财务资源，而不是拟申请的财务资源
（6）需包含关键干系人名单，而不只是关键用户名单
（7）未明确定义项目经理的权职。
【问题 2】（6 分）
A、A、B、D、B、C
【问题 3】（7 分）
1、为了避免在验收阶段出现的问题,小张应让相关干系人参与以下项目工作:
（1）需求收集工作，确保需求符合干系人的要求
（2）范围定义工作，明确项目边界
（3）质量测量指标的评审工作，确保质量标准合适
（4）日常的质量保证工作，确保干系人对项目质量提高信心
（5）计划评审工作，确保计划符合干系人的要求
（6）阶段性确认工作，确保每个阶段的交付成果满足干系人的需求
2、干系人绩效域预期目标：
①与干系人建立高效的工作关系；
②干系人认同项目目标；
③支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益；

淘宝店铺：yeren.taobao.com
微信公众号：野人老师

④反对项目的干系人没有对项目产生负面影响。

【问题 4】（6 分）

（1）×（2）×（3）√（4）×（5）√（6）×

【2024 年 5 月（第 2 批次）试题二】

计算题（25 分）

某项目计划工期为 10 个月，预算 210 万元，第 7 个月结束时，项目经理进行了绩效评估，发现实际完成了总计划进度的 70%。项目的实际数据，如表所示：

月份	PV（万元）	AC（万元）
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140
7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

【问题 1】（4 分）

根据项目数据表，可以确定（1）月份的实际花费最低，仅为（2）万元。

【问题 2】（6 分）

计算项目第 7 个月底时的 EV、CV、SV 值。

【问题 3】（8 分）

评估项目第 7 个月底时的绩效，并给出改进措施。

【问题 4】（7 分）

如果在第 7 个月结束时，找到了影响绩效的原因并纠正了项目偏差，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前？落后？不变？

【参考答案】

【问题 1】（4 分）

（1）7【2 分】 （2）5【2 分】

【野人老师点评：由题干中的表格所知各个月的实际花费分别为 1 月 35 万、2 月 20 万、3 月 25 万、4 月 15 万、5 月 25 万、6 月 20 万、7 月 5 万，可以确定 7 月份的实际花费最低，仅为 5 万】

【问题 2】（6 分）

表格里面列出的数据是前几个月累计的数据，如果转换成每月的实际数据，如下表:

月份	PV（万元）	AC（万元）
1	30	35
2	20	20
3	20	25
4	20	15

5	20	25
6	20	20
7	20	5
8	20	
9	20	
10	20	

第 7 个月底时 PV=30+20+20+20+20+20+20=150 万元
EV=210*70%=147 万元【2 分】
【野人老师点评：题目说是完成**总**计划进度的 70%，注意“总”字】
AC=145 万元
CV=EV-AC=147-145=2 万元【2 分】
SV=EV-PV=147-150=-3 万元【2 分】
【问题 3】（8 分）
因为 CV>0，SV<0
所以成本节约，进度滞后【2 分】
可以采取以下措施:【6 分】
①赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。
②快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。
③使用高素质的资源或经验更丰富的人员。
④减小活动范围或降低活动要求。
⑤改进方法或技术，以提高生产效率。
⑥加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期
【问题 4】（7 分）
BAC=210 万元
EV=147 万元
AC=145 万元
根据题目表述属于非典型偏差，所以
ETC=BAC-EV=210-147=63 万元【2 分】
EAC=AC+ETC=145+63=208 万元【2 分】
SPI=EV/PV=147/150=0.98，7 月份之前进度落后了，后 3 个月纠偏后按照计划进行，总体还是落后的【1 分】
所以项目完成时间较原计划落后【2 分】

【2024 年 5 月（第 2 批次）试题三】

某市计划建设人工智能计算中心、作为新质生产力的重要抓手，向城区内进行智能化转型的企业提供人工智能算力。该建设项目重要进行设备采购、平台软件采购，网络建设、软件开发等工作，投资额较大。

项目建设主管部门的申请报告被批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行了细致地研究和分析，可行性研究通过了主管部门审批，原因是缺少社会效益可行性分析。

建设单位报告后再次提交，由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的 A 设计院进一步评估项目可行性，A 设计院评估了项目的可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协

yeren.taobao.com 淘宝店铺 微信公众号：野人老师

议文件。A 设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工分析了评估，认为比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。

项目开始实施后，建设单位项目经理老陈为明确项目边界，实施了如下项目范围管理过程，规定项目输出相应文档。

过程	输出文档
规划范围管理	范围管理计划、（1）
收集需求	需求文件、（2）
定义范围	项目文件（更新）、（3）
创建 WBS	项目文件（更新）、（4）
确认范围	验收的可交付成果、变更请求、项目文件（更新）、（5）
控制范围	变更请求、项目管理计划（更新）、项目文件（更新）、（6）

项目经理老陈分解项目工作，形成的完整 WBS 如图所示：

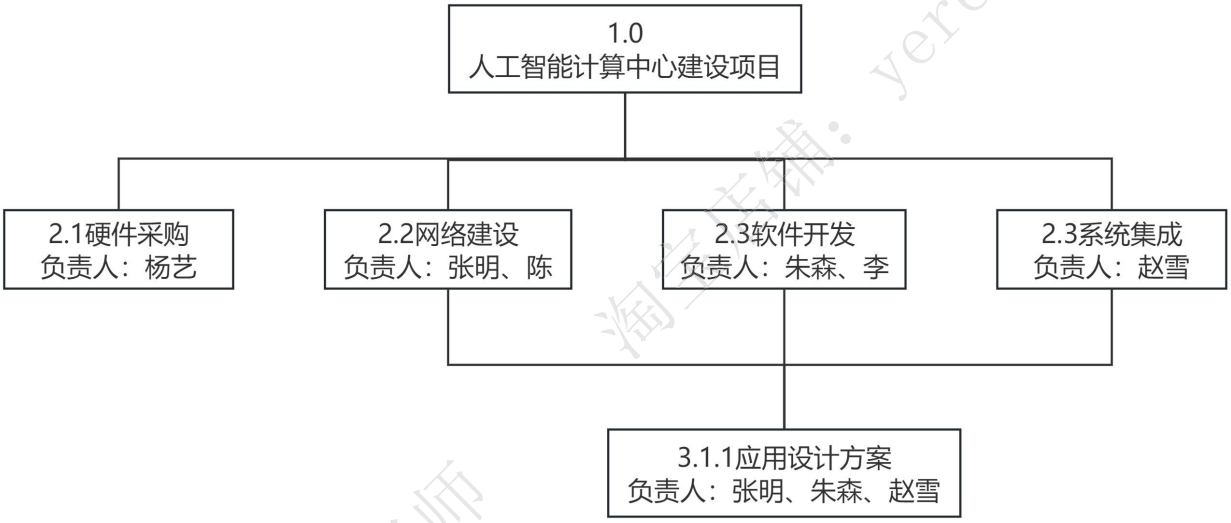

【问题 1】（8 分）
结合项目案例，请指出可行性研究中，社会效益可行性分析，包含哪些方面的内容。
【问题 2】（6 分）
结合案例，依据项目评估工作程序，请指出 A 设计院评估过程存在的问题。
【问题 3】（6 分）
请补充项目范围管理各过程输出中缺失的文档。
【问题 4】（5 分）
请指出老陈编制的 WBS 不妥之处。

【参考答案】
【问题 1】（8 分）
（1）对组织内部：品牌效益、竞争力效益、技术创新效益、人员提升收益、管理提升效益。
（2）对社会发展：公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益。
【问题 2】（6 分）
A 设计院评估过程存在的问题:
（1）没有成立评估小组。

（2）没有开展详细的调查研究。
（3）评估的依据不足，仅仅只是评估了项目的可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协议文件。
（4）缺少相关的评估专家。
（5）没有进行实质的分析与评估，只是初步分析了技术可行性分析。
（6）没有编写评估报告，只是在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告 6
（7）没有召开专家论证会。
（8）没有定稿评估报告。
【问题 3】（6 分）
（1）需求管理计划、（2）需求跟踪矩阵、（3）项目范围说明书、（4）范围基准、（5）工作绩效信息、（6）工作绩效信息。
【问题 4】（5 分）
老陈编制的 WBS 不妥之处有
（1）WBS 必须是面向可交付成果的
（2）WBS 的编制需要主要项目干系人的参与，老陈一人编制不妥
（3）WBS 应控制在 4-6 层，目前 WBS 的分解层级过于简单。
（4）WBS 底层应该支持计划和控制，目前的 WBS 底层无支持计划和管理工作。
（5）WBS 缺少项目管理和软件平台采购模块
（6）WBS 的编号不正确，从第 2 层开始，应该是 1.1、1.2、1.3 依次类推
（7）WBS 中的元素不能由多人负责，只能有一个人负责
（8）应用设计方案作为一个工作单元，只能从属于某一个上层单元，避免交叉从属。

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com
