2024年上半年案例分析试题和试题解析（5月26日第2批）

（由于机考后没有真题，题目为野人老师根据学员回忆的考试内容）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2024 年 5 月（第 2 批次）试题一】

某海关拟建设电子人工智能平台，采用光学字符识别技术（OCR），将多语种报关单、身份证件等文件转为电子文档，以提高报关效率。

项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目目的、项目目标（60 天内提高报关效率）、项目描述、项目边界定义、项目退出标准、拟申请的财务资源、关键用户名单、项目审批要求、项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准后，小张组建了项目团队。

电子订单人工智能平台的建设主要包括六个工作模块，内容和特点如下：

（1）平台硬件交付：包括人工智能服务器、网络、高拍仪等的采购、搭建、测试等，需求明确、建设方法成熟、要求训练数据到位前交付。

（2）数据采集和标注：要求数据小组一次性交付 50 万张相关报关单及身份证件图片及标注结果。

（3）OCR 模型调试：要求数据小组多次调试并交付模型，精度不断提高，直到实现关务部门认可的效果和性能。

（4）OCR 算法开发：创新程度高，团队没有同类项目开发经验，3 天就需要更新一次，确保开发方向正确。

（5）前端界面开发：需要展示界面风格，操作步骤多次向关务部门进行演示，尝试用各种选项澄清范围和需求，在最后完成可接受的全部功能。

（6）平台操作测试：平台边研发边上线，完成一个功能模块就需要向相关人员提供一次操作或维护培训，在最后一次培训结束后才算完成全部工作。

项目验收时，海关技术的负责人、关务部门代表首次受邀参与项目，在验收评审会中指出了诸多问题，包括平台关键功能不完整、项目计划不合理、算法精度差、识别速度慢等，表示不认可交付成果。

【问题 1】（6 分）

结合项目案例，请指出项目章程的内容存在哪些缺陷？

【问题 2】（6 分）

结合项目案例，请帮助小张为六个工作模块选择最适合的开发方法。

A. 预测型方法

B. 迭代型方法

C. 增量型方法

D. 敏捷型方法

（1）平台硬件交付（ ）

（2）数据采集和标注（ ）
（3）OCR 模型调试（ ）
（4）OCR 算法开发（ ）
（5）前端界面开发（ ）
（6）平台操作测试（ ）
【问题 3】（7 分）
（1）结合项目案例，请指出小张应让相关干系人参与哪些项目工作，以避免验收阶段出现的问题。
（2）有效执行干系人绩效域可以实现哪些预期目标？
【问题 4】（6 分）
结合案例，判断下列说法的正误（填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“×”）。
（1）变更请求必须经过 CCB 的审批。（）
（2）CCB 应负责提出合理、可执行的变更方案。（）
（3）CCB 由主要干系人共同组成，包括用户单位的关务部门代表人员。（）
（4）批准的变更请求不应导致项目管理计划的更新。（）
（5）CCB 是项目的所有者权益代表。（）
（6）CCB 是作业机构，不是决策机构。（）

微信公众号：野人老师
淘宝店铺：yeren.taobao.com

【2024 年 5 月（第 2 批次）试题二】

计算题（25 分）

某项目计划工期为 10 个月，预算 210 万元，第 7 个月结束时，项目经理进行了绩效评估，发现实际完成了总计划进度的 70%。项目的实际数据，如表所示：

月份	PV（万元）	AC（万元）
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140
7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

【问题 1】（4 分）

根据项目数据表，可以确定（1）月份的实际花费最低，仅为（2）万元。

【问题 2】（6 分）

计算项目第 7 个月底时的 EV、CV、SV 值。

【问题 3】（8 分）

评估项目第 7 个月底时的绩效，并给出改进措施。

【问题 4】（7 分）

如果在第 7 个月结束时，找到了影响绩效的原因并纠正了项目偏差，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前？落后？不变？

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yeren.taobao.com

【2024 年 5 月（第 2 批次）试题三】

某市计划建设人工智能计算中心、作为新质生产力的重要抓手，向城区内进行智能化转型的企业提供人工智能算力。该建设项目重要进行设备采购、平台软件采购，网络建设、软件开发等工作，投资额较大。

项目建设主管部门的申请报告被批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行了细致地研究和分析，可行性研究通过了主管部门审批，原因是缺少社会效益可行性分析。

建设单位报告后再次提交，由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的 A 设计院进一步评估项目可行性，A 设计院评估了项目的可行性研究报告，项目关键建设条件和工程的协议文件。A 设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工分析了评估，认为比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。

项目开始实施后，建设单位项目经理老陈为明确项目边界，实施了如下项目范围管理过程，规定项目输出相应文档。

过程	输出文档
规划范围管理	范围管理计划、（1）
收集需求	需求文件、（2）
定义范围	项目文件（更新）、（3）
创建 WBS	项目文件（更新）、（4）
确认范围	验收的可交付成果、变更请求、项目文件（更新）、（5）
控制范围	变更请求、项目管理计划（更新）、项目文件（更新）、（6）

项目经理老陈分解项目工作，形成的完整 WBS 如图所示：

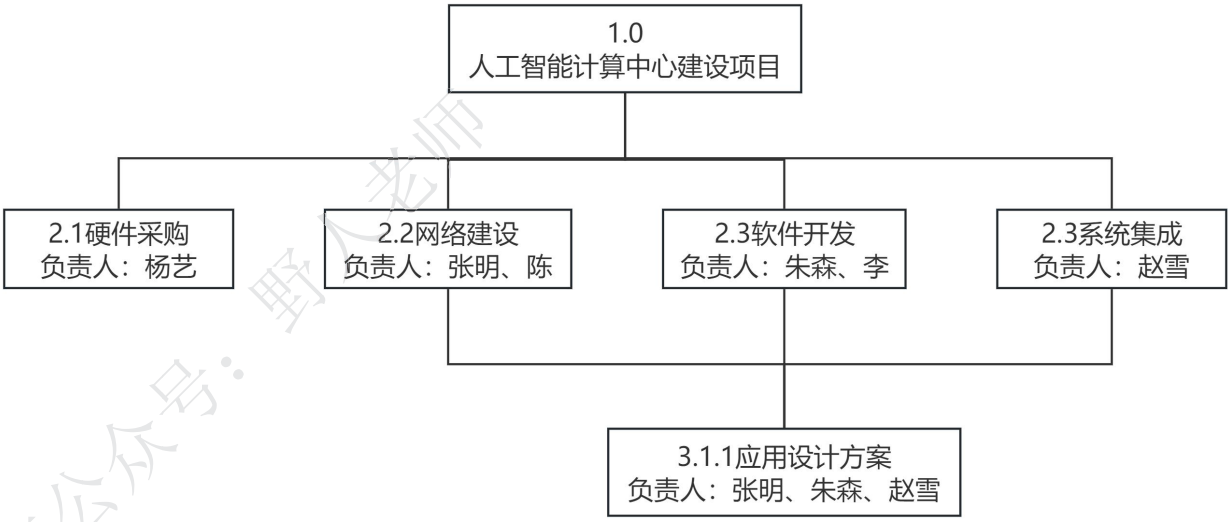

【问题 1】（8 分）

结合项目案例，请指出可行性研究中，社会效益可行性分析，包含哪些方面的内容。

【问题 2】（6 分）

结合案例，依据项目评估工作程序，请指出 A 设计院评估过程存在的问题。

【问题 3】（6 分）

请补充项目范围管理各过程输出中缺失的文档。

【问题 4】（5 分）

请指出老陈编制的 WBS 不妥之处。
