软考-案例&论文实战提分秘籍

【第一部分：案例】

1.案例评分标准

案例	评分
观点正确切题，按试题要求，针对材料作答，学科语言运用完整，表示清晰	10 分
观点正确，按试题要求，针对材料作答，学科语言运用恰当	9 分
观点基本正确，按试题要求，结合材料作答，表述一般	8 分
观点基本正确，表述一般，回答部分问题	6 分
观点基本正确，按试题要求作答	5 分
逻辑混乱，不按试题要求作答	4 分
分析错误，答非所问，不作答	0 分

2.案例找错改错真题汇总

【2021 年 5 月真题·高级】

2020 年某公司承接某地方法院的智慧法院信息系统项目，实现法院庭审流程信息化，项目要求引入智能语音技术，将庭审现场人员的语音实时转换成文字，既可在屏幕上输出显示，又可实时编辑，提高庭审记录的效率。

公司没有智慧法院的相关项目经验，选择刚毕业两年的小王担任项目经理，由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，考虑到公司从未有过智能语音识别方面的相关开发经验，小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，为项目组人员培训智能语音相关理论知识和常用算法，经过培训，对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。

项目实施过程中，甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直接让软件开发人员进行了修改，由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取 997 工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。

项目收尾时，小王发现交付的软件存在部分功能与设计文档不一致。

【问题】

结合案例，从风险识别的角度，指出该项目存在的问题。

【解析】

（1）将庭审现场人员的语音实时转换成文字，有可能设备出问题无法转换；

（2）选择刚毕业两年的小王担任项目经理没有经过培训，有可能造成项目失败的风险；

（3）由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，没有相关干系人参与，造成计划无法实施的风险；

（4）小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，李教授未必能融入团队造成团队效率低下的风险；

（5）对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。应做详细的自制/外购分析规避风险；

（6）甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直接让软件开发人员进行了修改，没有走变更的控制流程，为后期的工作开展带来了风险；

（7）由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取 997 工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。不能为了赶进度压榨员工，造成了人员离职风险；

（8）项目收尾时，小王发现交付的软件存在部分功能与设计文档不一致。没有做好监控，造成了开发风险。

【2021 年 11 月真题·高级】

某集团公司希望对总部现有信息系统进行升级改造，升级后的系统能收集整合子公司各类数据，实现总

部对全集团人力资源、采购、销售信息的掌握、分析及预测。

小王担任项目经理，项目交付期为60天。小王研究了总部提出的需求后，认为项目核心在于各子公司数据收集以及数据可视化及分析预测功能。各子公司数据收集可以以总部现有系统中的数据格式模板为基础，为各子公司建立数据上传接口。针对数据的分析预测功能，由于牵涉到人工智能等相关算法。目前项目组还不具备相关方面的知识储备，因此项目组对该模块功能直接外包。小王将数据收集与可视化工作进行了WBS分解，WNS的部分内容如下：

工作编号	工作任务	工期	负责人
…	…	…	…
2	系统设计	20天	王工
3	程序编制	30天	任工
…	…	…	…
3.2.1	人力资源模块编码	25天	孙工
3.2.2	采购模块编码	20天	赵工
3.2.3	销售模块编码	20天	赵工
…	…	…	…
4	系统测试与验收	5天	张工、李工
…	…	…	…

此外，虽然总部没有提出修改界面，但小王认为旧版的软件界面不够美观，让软件研发团队重新设计并更改了软件界面。

试运行阶段，总部人员试用后，认为已经熟悉旧版的操作模式，对新版界面的布局极其不适应；各子公司数据报送人员，认为数据上报的字段内容与自己公司的业务并不相关，填写困难。总部和各子公司的试用人员大部分认为新系统不是很好用。

【问题】

请结合案例，简要分析该项目经理在WBS分解中存在的问题。

【解析】

项目经理在WBS分解中存在的问题：

（1）WBS 的分解不应由小王一个人负责，应邀请项目所有团队成员及所有（主要）干系人参与；

（2）未对项目可交付成果进行全面识别和分析；

（3）WBS组件有多人负责；

（4）WBS不符合8/80原则；

（5）WBS没有包括管理工作；

（6）WBS没有包括分包出去的工作；

（7）WBS分解完成后未经项目干系人一致确认。

【问题】

请结合案例，除WBS分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。

【解析】

项目在范围管理中还存在的问题：

（1）未制定项目范围管理计划；

（2）未全面收集客户需求；

（3）未对需求进行跟踪；

（4）范围定义存在问题，未形成范围说明书；

（5）未进行范围确认；

（6）范围控制存在问题，变更未走管理流程；

（7）未与干系人进行良好沟通；
（8）存在范围蔓延的风险。

【2021 年 11 月真题·高级】

某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员。小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码做一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题】

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【解析】

项目在配置管理方面存在的问题：
（1）小杨不能负责项目质量的同时担任配置管理员；
（2）小杨不能直接编写和发布质量管理计划；
（3）小杨不能给小王开放所有的配置权限；
（4）小杨不能直接决定是否批准变更请求；
（5）小杨不能删除旧的代码。

【2022 年 5 月真题·高级】

A 公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型。A 公司承诺免费提供一个智慧社区 APP 小程序，并将其写入项目合同中，合同期为 6 个月。

项目经理小邱负责 APP 的开发，项目周期 4 个月，计划 2019 年 12 月上线。因合同中没有对 APP 给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了 APP 的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区网发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了 APP 的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019 年 7 月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字。

后期，项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019 年 12 月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该 APP 进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

【问题】

结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏？如有，请指出遗漏的内容。

【解析】

有遗漏；
（1）没有对可交付成果进行确认；
（2）没有对质量标准进行确认；
（3）没有对审核和承诺有清晰的表达确认；
（4）没有对项目范围风险进行确认；

（5）没有对项目范围是否覆盖了需要完成产品或服务进行的所有活动进行确认。

【2022 年 5 月真题·高级】

A 公司承接某市机关事业单位养老保险信息系统，项目覆盖整个市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组，并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如下图所示：

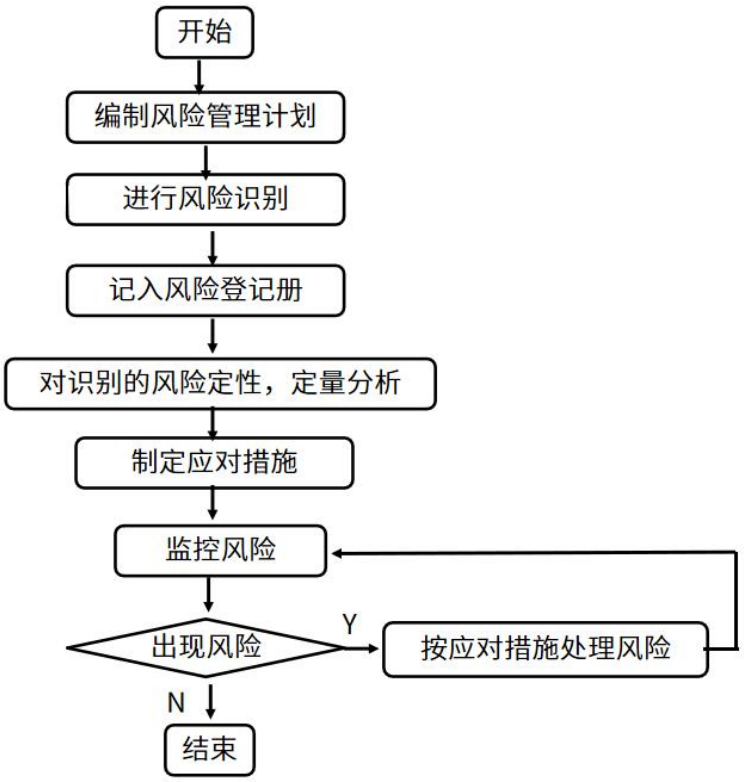

项目组对风险登记册中的各风险制定了相应措施，部分措施如下所示：

风险类别	风险描述	措施
人员风险	人员情绪风险	调离项目组
技术风险	缺少数据库设计和相关技术储备	外包
技术风险	需要新的数据安全管理技术	培训
管理风险	非预期事件造成成本增加的风险	应急储备
管理风险	审批流程繁琐	加强部门沟通，建立协调配合机制

此外，在信息安全方面，养老保险数据信息涉及个人隐私，如果不法分子突破安全限制，会造成用户隐私泄露或信息篡改。因此项目组采用 PKI 技术为系统的安全运行提供了有效的保障。

【问题】

请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

【解析】

（1）出现风险后应该从风险识别开始，识别是否有新风险出现。

（2）对识别的风险管理这一步应该在对识别的风险定性、定量分析之后进行。

（3）出现风险后需要重新更新风险应对措施。

（4）出现风险后需要对风险进行再评估、风险审计，还需要对项目风险实际结果和风险应对策略的实际结果进行比较。

（5）出现新风险后可能会对进度、成本造成影响，该流程未考虑。

【2022 年 11 月真题·高级】

某集团为提升企业服务水平和办公效率，通过招投标选定 A 公司为其开发企业协同办公管理信息系统。A 公司组建了项目团队，任命小张担任项目经理，并将系统中的数据可视化模块外包给某一软件公司。

在制定项目管理计划过程中，小张让负责研发的小陈制定沟通管理计划，作为项目管理计划的子计划。小陈认为编制沟通管理计划是一件重复性的工作，于是参考过去的项目管理计划，简单进行了修改后放入了项目计划文件夹下作为公共信息供大家查阅，完成后的沟通管理计划表如下：

沟通内容	沟通方法	沟通时间	参与人	沟通目的
每周工作例会	谈话	每周五 16:00	A 公司项目组成员	汇报进度，解决遇到问题
方案评审	会议	阶段性	A 公司项目组相关成员	确定方案
项目阶段性总结	电子邮件	里程碑	A 公司主管领导、项目	阶段性汇报
软件开发技能培训	在线课程	临时	A 公司软件研发人员	提高软件研发技能
项目交流会	电话	项目启动、结束时	A 公司项目组成员，客户外包公司	各方了解项目情况

每次参加客户召集的项目沟通会，小张会根据项目组人员空闲时间临时安排参会人员。参会人员不固定，新的参会人员对之前会议需要确认的内容毫不知情，这种情况时有发生。引起客户强烈不满，沟通不好，效率也不高。

在项目进行中，客户对数据可视化模块要求增加了新功能。经变更确认后，小张电话通知外包公司增加。新功能项目验收时发现新功能并未实现。

【问题】

在下表中补充沟通管理过程并写出该项目在沟通管理各过程上存在的问题。

沟通管理过程	存在问题
过程 1：规划沟通	
过程 2：	
过程 3：控制沟通	

【解析】

沟通管理过程	存在的问题
规划沟通	（1）项目经理对规划沟通管理工作重视程度不够。 （2）不应该由负责研发的小陈制定沟通管理计划，工作安排不合理，用人不当。 （3）制定沟通管理计划未结合项目实际情况，只参考了以往的计划，进行简单修改。 （4）沟通管理计划不够详细，不够完善，部分沟通方法错误，参与人不全。 （5）制定沟通管理计划后没有经过评审。
管理沟通	（1）项目沟通会不应该由客户召集。 （2）会议应该要定时召开，案例中没有明确开会时间。 （3）每次开会，不应该临时安排参会人员，应提前通知安排。 （4）应该明确沟通人员，不应随时变动参会人员。 （5）召开会议前，应提前准备会议议题。 （6）沟通应当注重效率。 （7）未能及时与客户沟通，引起客户不满。 （8）针对沟通存在的问题，未及时处理，导致经常发生同样的问题。
控制沟通	（1）沟通结果未能形成相关记录文件。 （2）变更通知仅通过电话告知，未开展正式的书面流转。 （3）未对沟通结果进行监控。

【2022 年 11 月真题·高级】

A 公司为提升市场竞争力，计划针对制造业数字化转型的需求，新开发一套数字化软件，实现在工业产品生产和制造过程中数据采集，分析和决策功能。公司让产品部前期对市场需求进行调研。产品部对软件预期能产生的经济效益和社会效益，进行了详细的分析，并针对这两部分，编制了《可行性分析报告》。公司高层领导看了报告后，认为该软件未来会为公司带来巨大的收益，当场拍板决定启动项目，要求产品部补充编制《项目建议书》，并组建项目团队。

小王作为某名校计算机专业刚毕业的研究生，被公司委以重任，担任该项目的项目经理。研发负责人向小王建议为配置管理设置一名专职配置管理员，但小王认为有配置管理工具对代码进行控制，大家只要对程序代码做好版本控制就可以了，考虑到项目组人员紧张，没必要再安排专人负责配置管理工作。

开发过程中，为避免多人同时修改代码导致冲突，研发人员要先将服务器上的代码下载，待编码完成后，使用文本对比工具将代码中修改的部分进行上传整合。

软件研发完成测试通过后，研发人员将最终版本软件和软件使用说明书提供给产品部，产品部人员发现说明书描述和内容与软件不完全一致，于是将问题反馈给小王，小王经检查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

【问题】

请结合案例，分析项目在可行性研究和配置管理中存在哪些问题。

【解析】

可行性研究方面：

（1）未形成项目建议书，缺少可行性研究的依据。

（2）可行性研究缺少机会可行性研究和初步可行性研究。

（3）可行性研究内容不够全面，产品部仅对软件预期能产生的经济效益和社会效益进行研究，还应该包括技术可行性、运行环境可行性以及法律可行性等进行研究。

（4）缺少项目论证和评估环节，先论证后决策是现代项目管理的基本原则，项目没有经过论证，公司高层直接拍板启动项目。

配置管理方面：

（1）项目经理小王欠缺项目管理和配置管理的经验。

（2）没有设置专职的配置管理员。

（3）没有制定一套完整配置管理计划，并按计划实施。

（4）没有建立有效的统一规范的配置项管理制度。研发人先将代码下载，使用文本对比工具将修改部分上传整合，进度缓慢。

（5）没有进行有效的配置审计，出现说明书描述和内容与软件不完全一致的情况。

（6）版本管理混乱，查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

【2023 年 5 月真题·高级】

为实现空气质量的精细化治理，某市规划了智慧环保项目。该项目涉及网格化监测、应急管理、执法系统等多个子系统。作为总集成商，A 公司非常重视，委派李经理任项目经理，对公司内研发部门与项目相关的各产品线研发人员及十余家供应商进行统筹管理。李经理明确了关键时间节点，识别出项目干系人为客户和供应商后，开始了项目建设工作。

项目开始建设 5 个月后，公司高层希望了解项目情况，要求李经理进行阶段性汇报。李经理对各方面工作进展进行汇总，发现三个问题：一是原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位，部分研发完成的功能无法部署到客户现场与客户进行演示确认；二是 S 公司作为 A 公司的供应商，承担空气质量监测核心算法工作，一直与客户方直接对接，其进度已经不受李经理掌控，且 S 公司作为核心算法国内唯一权威团队，可以确保算法工作按期交付，因此其认为不需要向李经理汇报工作进展；三是公司研发部门负责人因其他项目交付紧迫性更高，从该项目抽调走了 2 名研发人员张工、王工，项目目前研发人员的空缺需要后续补充。

李经理忧心忡忡，向公司汇报完项目进展情况后，公司政策研究院相关领导表示国家在环境执法方面的法律法规本月初已经进行了较大改版，项目相关子系统会有关联；营销副总裁听完项目汇报后表达不满。该项目作为公司的重点项目，希望作为全国性的标杆项目进行展示和推广，但当前各子系统的研发成果基本照搬了公司现有产品，没有任何创新性的体现，不利于公司后期的宣传推广，PMO 提醒李经理依据财务部门推送的数据，公司对部分供应商已经根据进度完成了第二节点款项支付，但当前 A 公司作为总集成商，与客户的第二个合同付款节点还未到，项目的成本支出和收益方面将面临较大的压力。人力资源负责人提醒李经理，项目成员张工和王工的本月绩效评价还未提交，截止日期为 2 天以后。

【问题】

结合案例，请指出李经理在资源管理和沟通管理方面存在的问题。

【解析】

资源管理方面存在问题：

（1）没有制定资源管理计划；

（2）没有做好控制资源的工作，原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位；

（3）没有及时获取项目所需资源，导致项目研发人员空缺；

（4）李经理欠缺管理经验。

沟通管理方面存在问题：

（1）没有制订沟通管理计划；

（2）没有分析干系人的沟通需求；

（3）管理沟通存在问题，没有主动地向公司高层做阶段性的汇报；

（4）控制沟通存在问题，李经理没有做好与 S 公司的沟通工作，不能让 S 公司直接与客户对接，也不能可以确保算法能够按期交付就不进行工作汇报等。

【2023 年 5 月真题·高级】

2020 年某公司承接某地方法院的智慧法院信息系统项目，实现法院庭审流程信息化，项目要求引入智能语音技术，将庭审现场人员的语音实时转换成文字，既可在屏幕上输出显示，又可实时编辑，提高庭审记录的效率。

公司没有智慧法院的相关项目经验，选择刚毕业两年的小王担任项目经理，由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，考虑到公司从未有过智能语音识别方面的相关开发经验，小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，为项目组人员培训智能语音相关理论知识和常用算法，经过培训，对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。

项目实施过程中，甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直接让软件开发人员进行了修改，由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取 997 工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。

项目收尾时，小王发现交付的软件存在部分功能与设计文档不一致。

【问题】

结合案例，请分析项目存在的问题和风险。

【解析】

（1）数学化城市管理项目，作为政府重点项目，应该通过公开招标方式选择承建方，不应该直接把建设任务交给当地民营企业；

（2）A 公司只研究之前的文档，只参考了其他城市的经验，没有根据当前项目的实际情况进行调研论证，脱离项目实际，容易存在变更风险；

（3）城市管理的建设要牵涉到多个政府部门，干系人多，沟通可能存在风险；

（4）交通数据，没有统一的数据标准，来源于多个系统，数据散乱，不规范，开发存在风险；

（5）为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A 公司打算建立统一的数据元标准，没有与相关干系人进行确认，存在需求风险；
（6）A 公司没有进行数据战略制定，缺少数据战略规划、数据战略评估、数据战略需求评估等数据管理系统过程，没有全面系统地规划数据管理，存在整体管理风险；
（7）没有储备数字管理各层级人才对数据进行有效管理，存在数据管理质量风险；
（8）没有进行数据安全方面的考虑，存在安全风险；
（9）A 公司过去一直做银行信息管理系统，不具备数学化城市管理项目的管理经验。

【2022 年 11 月真题·中级】

某小区进行物业服务提升，拟上线物业管理系统。该系统包括门禁管理、停车管理、维修服务管理收费管理等核心功能及业主论坛等其他功能。物业公司准备通过公开招标的方式采购该系统，并且发布了招标公告。

信息服务公司 A 得知招标信息后，找到物业公司的负责人，详细介绍了公司的业务背景，提出可以为物业公司定制系统，完全按照物业公司的需求范围和时间要求来完成，并承诺提供终身免费维护。物业公司与 A 公司提前签了意向合同，不过流程仍按照招投标来走，A 公司和物业公司一起准备了一份投标书。

最终物业公司共收到三家公司的投标书，物业公司将开标和评审安排在同一天，评审工作由 A 公司协助物业公司来完成。物业公司和 A 公司一起针对其他两家公司投标材料进行了评审，计划借鉴其他两家公司方案，并宣布 A 公司中标，2 个月后物业公司和 A 公司签订了合同。

项目实施的过程中，公司将门禁管理系统和停车管理系统分包给另外一家专门做门禁和停车管理系统的公司来实施。

【问题】

请指出本案例中招投标过程中存在的问题。

【解析】

（1）物业公司与 A 公司提前签了意向合同不妥，属于招标人与投标人串通投标，违背了公平的原则；
（2）A 公司和物业公司一起准备了一份投标书不妥，物业公司不能参与投标书制定；
（3）评审工作由 A 公司协助物业公司来完成不妥，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（4）A 公司计划借鉴其他两家公司方案不妥，招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
（5）2 个月后物业公司和 A 公司签订了合同不妥，合同签订期限：在投标有效期内及发出中标通知书之日起 30 日内。
（6）A 公司将门禁管理系统和停车管理系统进行分包不妥，不得分包主体、关键工程。

【2022 年 11 月真题·中级】

A 公司承接了一个信息系统开发项目，任命小安为质量经理。由于前一个项目延期，小安在项目实施阶段才进入本项目。

进入项目后，小安按照项目计划编制了质量管理计划，规划了质量审计、功能测试、集成测试、验收测试等活动，并为各测试活动安排了相应测试人员。结合需求，小安在以往类似项目的基础上，修改确定了本项目的测试用例，随后分发给了测试人员，要求严格按照测试用例执行。

在功能测试时，测试人员发现测试用例对应的某项功能缺失。经查阅，需求中没有此功能，于是测试人员关闭了该问题。灰度发布后，用户在试用过程中发现了一些问题，经检查，小安发现有个别集成测试问题未关闭。为了按期上线，小安决定将灰度发布后发现的问题作为遗留项后续再处理。

【问题】

（1）结合案例，请指出小安在此项目中的工作是质量保证还是质量控制?

（2）指出本案例中质量管理方面存在的问题，并给出正确的做法。

【解析】

（1）小安的工作属于质量保证。

在案例中，小安结合需求，在以往类似项目的基础上，修改确定了本项目的测试用例，随后分发给了测试人员，要求严格按照测试用例执行。属于确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。因此是质量保证。

（2）①小安作为质量经理不妥，因为前一个项目延期，小安在项目实施阶段才进入本项目，导致无法全过程的参与项目工作。

②只按照项目计划编制质量管理计划不妥，应该根据本项目的实际具体情况来编制，还需要参照干系人登记册、风险登记册、需求文件等进行编制。

③不应由小安独立编制质量管理计划，应邀请相关干系人参与并由项目经理审核。

④实施阶段编制质量管理计划不妥，应该在项目早期就进行质量管理计划编制和评审。

⑤质量管理计划中没有明确规定的质量测量和质量基准。

⑥质量保证没有设置 QA 人员，应设置对应的 QA 人员。

⑦质量保证执行不到位，发现问题没有及时反馈，应该及时反馈。

⑧质量控制环节缺失，对最后的结果没有进行检查，例如评审和测试，最后才发现有个别集成测试问题未关闭。

⑨质量控制不到位，没有走质量变更控制流程，小安在以往类似项目的基础上，直接修改确定了测试用例。

⑩相关人员没有做好文档配置工作。功能测试时，测试人员发现测试用例对应的某项功能缺失。经查阅，需求中没有此功能。

⑪缺少质量标准规范，没有建立全面的质量保证体系，小安将软件发布后发现的问题作为遗留项后续再处理。

【2022 年 11 月真题·中级】

A 集团公司信息中心负责集团及子公司的信息系统建设和运行维护管理工作。为了确保系统安全稳定运行，并为各业务部门（系统使用方）提供良好服务，信息中心将系统运行维护工作外包给了 B 公司，B 公司高层非常重视该项目，任命张伟担任项目经理。在项目初期，张伟编制了干系人清单，部分内容如下：

一类干系人（主要干系人）：A 公司信息中心管理层。

二类干系人（次要干系人）：A 公司信息中心技术人员、B 公司管理层、B 公司行政部门（为项目提供备件、人员培训等支持）。

三类干系人（一般干系人）：A 公司业务部门人员、B 公司项目组成员、其他人员。

为确保项目沟通顺畅，张伟制定了项目沟通计划，部分内容如下：

沟通方式	沟通内容	沟通频率	沟通对象
现场会议	项目日常工作进展	每周	A 公司信息中心技术人员、B 公司项目组成员
现场会议	项目阶段性总结、汇总	每月	A 公司信息中心管理层、B 公司管理层
电话	日常工作	按需	所有干系人
电子邮件	项目周报	每周	所有干系人
在线知识库	常见问题解决方案	随时	A 公司信息中心技术人员、A 公司业务部门人员、B 公司项目组成员

项目开展三个月后，B 公司管理层收到了 A 公司信息中心管理层的投诉：一是对项目的进展情况不了解；二是业务部门反馈服务热线总是占线。张伟解释：很难协调双方公司管理层同时到场，月度项目汇报现场会议一直未能召开；A 公司业务部门人员不知道有在线知识库，遇到的大小问题都打服务热线造成了占线。

【问题】

结合案例，请指出张伟在项目沟通管理与干系人管理中存在的问题。

【解析】
（1）没有编制干系人管理计划；
（2）没有管理干系人的参与，收到投诉才知道 A 公司管理对项目进展情况不了解；
（3）没有进行及时跟踪和监控，导致项目开展 3 个月后，才发现诸多沟通问题；
（4）张伟在沟通频率方面掌握不够好。作为项目经理，没有统筹协调时间，导致月度项目汇报现场会议一直没有召开；
（5）张伟没有同步相关信息，导致 A 公司成员不知道在线知识库增加了合作过程中的沟通成本；
（6）张伟在沟通内容方面存在问题，对于不同的干系人应该采用不同的表现形式，比如对于客户高层和本公司高层领导，可以采用图、表、折线等直观易懂的方式展示；
（7）张伟对 A 公司没有建立有效的沟通机制，与本公司业务部门的负责人沟通也存在问题，没有及时向其反馈清楚工作绩效，以及服务热线一直占线。

【2023 年 5 月真题·中级】

A 公司跨国收购了 B 公司的主营业务，保留了 B 公司原有的人员组织结构和内部办公系统，为了解决 B 公司内部办公系统与 A 公司原有系统不兼容的问题，财务、人力、行政部门联合向公司高层申请尽快启动系统和业务的整合。A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理，并要求整合工作 3 个月内完成。A 公司原有的办公系统由 IT 部门自主开发维护，IT 部门目前没有人员可以投入该项目。

王工在调研时发现 B 公司的办公系统是由 C 公司成熟的商业办公系统裁剪形成，决定直接使用 C 公司的成熟系统，并由 C 公司承接此项目。

C 公司依据 A 公司原有办公系统编写了需求说明书，报价 500 万并承诺 3 个月内完工。项目经理审核需求说明书的内容后，申请了 500 万项目经费，并通知 C 公司按照需求说明书进行后续实施。

3 个月后，系统上线试运行。员工反馈新系统操作复杂繁琐，与原有办公系统流程不一致，即使简单的报销、请假都需要多次流转。另外系统的本地化也没有做好，附带的页面说明晦涩难懂，系统交互及翻译都是“直译”，没有考虑中外思维和文化差异，系统已经上线试运行，要想根本解决问题需要重新梳理和调整所有交互方式：

同时大量员工反映，页面的访问和加载速度慢，严重影响办公效率，分析发现 C 公司没有国内网络服务资源和资质，无法保证国内访问的速度和稳定性，需要追加费用租用国内 CDN 服务。

【问题】

结合案例，请指出项目在立项管理和需求管理方面存在的问题。

【解析】
（1）A 公司领导指定 HR 总监王工担任项目经理不妥，王工在项目管理方面经验不足；
（2）王工因为 B 公司的办公系统由 C 公司裁剪形成，就决定由 C 公司承接项目太过草率，缺乏详细的分析；
（3）C 公司依据 A 公司原有办公系统编写需求说明书不妥，应根据 A 公司需求来报价；
（4）项目经理不能一个人审核需求说明书，应组织主要干系人参与，且不能根据 C 公司的报价来申请项目经费；
（5）C 公司在做需求说明书时，缺乏与主要干系人的沟通；
（6）项目经理王工在立项时，没有制定项目建议书；
（7）王工在立项时未进行可性行分析，未做项目评估；
（8）王工在需求管理时，监控不力，到系统上线试运行时才发现存在很多问题。

【2023 年 5 月真题·中级】

某公司有自己的质量管理体系，其中配置管理程序已运行多年。由项目经理牵头组建变更控制委员会（CCB）：在创建配置管理环境后，并经过变更申请、变更评估、变更实施后，方可发布配置基线的变化。

通常公司项目在软件封版后，再做一次发布验证，通过后即可上线。近日，项目 A 已封版，版本号为 10.5.0，但项目经理收到测试人员的反馈，封版软件上发现多个问题，其中有两个问题严重影响用户体验。于是项目

经理安排研发人员紧急解决，并向配置管理员提出变更申请。研发人员在 10.5.0 版本上导入问题 1 的修改后，将版本号更新为 10.6.0；在 10.5.0 版本上导入了问题 2 的修改后将版本更新为 11.0.0。

新版本由项目经理发布给项目组。

【问题】

结合案例，请指出项目 A 在配置管理中存在的问题。

【解析】

（1）项目经理没有带领团队制定配置管理计划；
（2）项目经理没有单独为 A 项目做配置识别；
（3）没有安排独立的配置管理员；
（4）没有定期生成配置状态报告；
（5）没有进行配置审计；
（6）软件封版后，再做发布验证不妥，应该做完发布验证后再封版；
（7）项目经理监控不力，在收到测试人员反馈后才发现问题；
（8）无论情况多紧急，都要走完变更流程后才能安排人员解决问题；
（9）项目版本管理不妥，没有草稿，修改，正式版本的区分；
（10）版本号变成 10.6.0 后还用版本号 10.5.0 的来修改问题 2 不妥，这样会造成问题 1 仍然存在；
（11）新版本由项目经理发布给项目组不妥，应该由 CMO 发布；
（12）配置管理的分库有问题，应该把配置细分为开发库，受控库，产品库。

【第二部分：论文】

1.论文评分标准

论文	评分
切合题意	23 分（30%）
应用深度与水平	15 分（20%）
实践性	15 分（20%）
表达能力	11 分（15%）
综合能力与分析能力	11 分（15%）

2.论文范文示例

论信息系统项目的干系人管理

╳╳市“智慧物价”信息综合管理平台系统项目是在政府加强对市场物价调控能力的背景下于 2021 年 7 月由╳╳市物价局启动的，我公司中标该项目，中标金额为 780 万元，其中软件部分为 360 万元。本人在该项目中担任项目经理，负责项目的全面管理。项目历时一年于 2022 年 6 月通过客户方的验收。该项目旨在建立一套集物价信息采集、分析、处理、发布于一体的系统，包括价格监测预警、价格应急监测、价格监督检查、商品价格管理、价格认证管理、成本信息管理、价格信息发布、价格行政审批、价格调节基金监管、12358 投诉举报联动、价格信息互动服务、收费管理、协同办公平台及物价门户网站等十四个子模块，涵盖了该单位的主要业务工作。系统采用 J2EE 体系结构，可实现 B/S、手机客户端等多客户端接入，开发环境采用 eclipse（Helios Service Release 1），数据库采用 Oracle11g。

由于该系统具有建设规模大（涵盖物价部门几乎所有业务），建设时间紧（建设期限为一年），涉及的干系人多（内部干系人包括项目组各类成员、公司领导和相关部门人员，外部干系人不仅包括市局各科室，也包括 12 个区县物价局的相关人员、运营商等），参与的项目成员多（高峰时达到 60 人，我将小组成员分为硬件集成部署组、数据中心组、软件开发组、平台测试组（四个小组），采购的货物众多（网络及安全设备、存储设备、服务器、负载均衡、统一认证、虚拟化平台、数据库、触摸屏、信息采集设备等）等特点，为了保证项目圆满完成，我组建了强矩阵的项目组织结构，通过有效的项目管理，特别是出色的干系人管理，

带领项目团队全体成员经过奋战获得了良好的绩效，取得了项目的成功。本文将围绕该项目的干系人管理进行重点讨论。

一、识别干系人

项目启动阶段，我们就根据《项目章程》等相关文件，采用干系人分析和会议的方式，识别出了项目中绝大部分干系人，并把干系人的信息登记进《干系人登记册》中。总有一些不明显甚至暗藏的项目干系人，所以全面识别项目干系人并不是很容易。在项目开始时，要认识到暗藏的项目干系人也会对项目产生重要影响。不要担心识别出的干系人多，可以通过后面的干系人分析并区分出重要、次要甚至不需要加以管理的干系人。被识别的某些干系人，对项目不会产生实质性的影响，只需加以观察即可。如果某些干系人不能够被识别出来，就说明存在问题，说不定哪一个被遗漏的干系人将给项目带来很大的麻烦。

二、规划干系人管理

我利用干系人登记册和干系人分析矩阵认真分析每个项目干系人的利益领域和利益大小，影响领域和影响大小，把干系人的利益和影响都可视化。一一列出干系人的利益点（包括负面利益），并对每个利益点赋予一定的权重，然后分析每个干系人在项目上的总体利益大小。采用类似的方法，评估出每个干系人在项目上的总体影响大小。据此，依据权重进行排序，分析出干系人的重要程度，以便有重点的做好干系人管理。有句话，屁股决定脑袋，但最终是利益决定立场，所以支持或反对项目的程度是随着正面或负面利益的大小而变化的。除了分析利益和影响外，还要分析干系人对项目的认知程度、施加影响的紧急程度，以及为项目所用的知识技能。弄清楚项目干系人对项目的各种情况，以便以后加以利用和应对。如果干系人数量较多，就应该按照一定的标准进行归类，以方便管理。经过分析和归类，编制出《项目干系人管理计划》，其中记录对干系人的分析结果以及对不同干系人将要采取的管理措施。

三、管理干系人

管理干系人参与就是执行项目干系人管理计划，让和项目有关的和能影响项目的人，让他们积极参与项目的建设，面对消极的干系人，应如同面对积极的干系人一样，我积极寻求解决问题的方法；充分理解他们，设法把项目对他们的负面影响降低到最低程度，甚至可以设法使项目也为他们带来一定的正面影响。直接面对问题，要比拖延、回避有效得多。让项目干系人满意是项目管理的最终目的，让干系人满意，不是简单的被干系人牵着鼻子走，而是切实弄清楚干系人的利益追求并加以适当引导，满足他们合理的利益追求。项目管理要在规定的范围、时间、成本和质量下完成任务，最终还是要让项目干系人满意。所以，必须把干系人的利益追求尽量明确、完整的列出，并以适当方式请干系人确认。特别注意干系人之间的利益平衡，由于各干系人之间或多或少地存在利益矛盾，无法同时同等程度的满足所有干系人的利益，但应该尽量缩小各干系人满足程度之间的差异，达到一个相对平衡。项目干系人管理的一个核心问题，就是在众多项目干系人之间寻找利益平衡点。要承认和理解利益差别甚至是冲突，并进行协商。依靠沟通解决干系人之间的问题，通过沟通，不但能及时发现项目干系人之间的问题，更重要的是能够达到相互理解、相互支持，直至问题解决。对于沟通，我建立了良好的沟通机制和沟通计划，并加以管理。

四、控制干系人参与

干系人通常站在自己角度思考问题，缺少全面认知，因此我在干系人对项目产生的影响偏离预期时进行干预，更新干系人管理计划，提高其活动效率和效果，我们也注意收集沟通的效果，如果发现沟通效果不理想，干系人不满意时，我们会研究和修正所采用的沟通方式，目的就是通过不断调整沟通方式，直至找到最合适的沟通方式让干系人满意，从而更好地支持项目建设工作。

通过有效的项目干系人管理，XX 市“智慧物价”信息综合管理平台系统于 2022 年 6 月 20 日全部上线并顺利通过了用户的验收，在合同规定的完工时间前 10 天左右圆满完成了各项任务。截止目前系统已上线并运行了 5 个多月的时间，运行状况良好，得到了用户的一致好评。在本项目干系人管理方面，我们实践并总结了如下经验：必须把项目干系人的满意度当成项目管理中的一个重要部分，时时了解项目干系人的期望，充分的组织和发挥全部项目干系人的作用来保证项目的成功，干系人管理做的不好，项目实施推进工作就会受到来自也干系人方面的诸多阻力。项目虽然取得了不错的成绩，但在干系人管理方面还是存在不少需要改

进的地方，如：由于数据采集设备的供应商技术服务负责人的变动，在设备调试阶段没有及时获得相关的技术支持服务，造成数据中心组采集测试工作滞后 3 日，在和供应商积极沟通期间，临时向生产厂家借调相关的技术工程师进行安装调试服务，保证的后续项目施工工作的顺利开展。总结经验，吸取教训，相信通过不断的积累和不懈的努力，我的信息系统项目管理能力一定可以得到不断提高。
