十大管理－重点内容汇总

六个默写的点	重点关注	输入输出	计算类
1.管理过程 2.挣值分析公式 3.控制进度 4.质量成本法 5.冲突管理 6.风险应对策略	1.项目章程内容 2.变更流程 3.三个基准：内容、输出过程 4.需求相关工具 5.质量相关工具 6.进度计划类型 7.成本估算、制定预算含义 8.资源管理四个五 9.权力/利益方格 10.沟通方法区别 11.定性风险工具 12.规划采购、实施采购含义 13.合同类型	1.工作绩效数据、信息、报告相关输入输出 2.控制质量、确认范围输入输出	1.挣值分析 2.关键路径：工期、总浮动时间、自由浮动时间 3.三点估算 4.净现值、投资回收期、投资收益率 5.图论、科学决策、线性规划、动态规划

六个默写的点

1.管理过程

整合管理	范围管理	进度管理	成本管理	质量管理
1.制定项目章程 2.制订项目管理计划 3.指导与管理项目工作 4.管理项目知识 5.监控项目工作 6.实施整体变更控制 7.结束项目或阶段	1.规划范围管理 2.收集需求 3.定义范围 4.创建 WBS 5.确认范围 6.控制范围	1.规划进度管理 2.定义活动 3.排列活动顺序 4.估算活动持续时间 5.制订进度计划 6.控制进度	1.规划成本管理 2.估算成本 3.制定预算 4.控制成本	1.规划质量管理 2.管理质量 3.控制质量
资源管理	**沟通管理**	**风险管理**	**采购管理**	**干系人管理**
1.规划资源管理 2.估算活动资源 3.获取资源 4.建设团队 5.管理团队 6.控制资源	1.规划沟通管 2.管理沟通 3.监督沟通	1.规划风险管理 2.识别风险 3.实施定性风险分析 4.实施定量风险分析 5.规划风险应对 6.实施风险应对 7.监督风险	1.规划采购管理 2.实施采购 3.控制采购	1.识别干系人 2.规划干系人参与 3.管理干系人参与 4.监督干系人参与

2.挣值分析公式

进度偏差 SV＝EV－PV

成本偏差 CV＝EV－AC

进度绩效指数 SPI＝EV/PV

成本绩效指数 CPI＝EV/AC

非典型：EAC＝AC+（BAC－EV）

典型：EAC＝AC+（BAC－EV）/CPI＝BAC/CPI

进度成本同时作用：EAC＝AC+（BAC－EV）/（CPI*SPI）

TCPI＝（BAC－EV）/（BAC－AC）

TCPI＝（BAC－EV）/（EAC－AC）（BAC 不可行，分母变 EAC）

VAC＝BAC－EAC

3.控制进度

（1）赶工；

（2）快速跟进；

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（4）减小活动范围或降低活动要求；

（5）改进方法或技术，以提高生产效率；

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工。

4.质量成本法

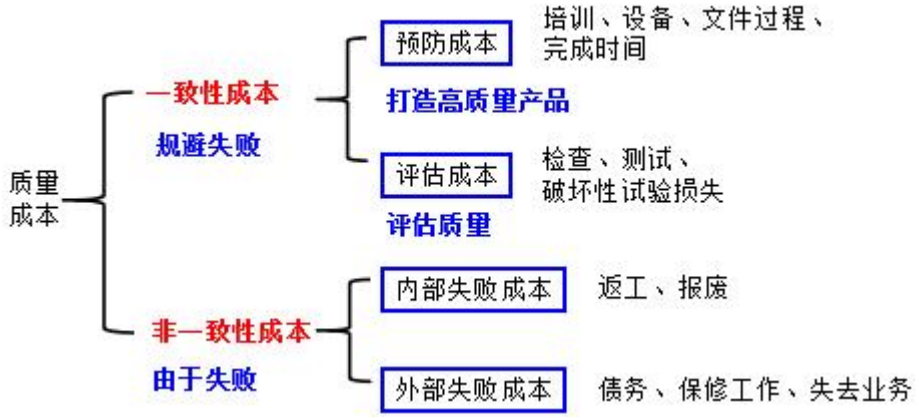

5.冲突管理

冲突管理	含义
撤退/回避	退出冲突，将问题推迟或推给别人
缓和/包容	也叫“求同存异”，强调一致性而非差异，考虑其他方面的需求
妥协/调解	各退一步，各方都在一定程度上满意
强迫/命令	推行一方的观点，利用权力来强行解决紧急问题
合作/解决问题	◆ 合作：集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案 ◆ 解决问题：冲突各方积极行动，选择一个最合适的方案

6. 风险应对策略

威胁应对措施	机会应对措施	整体项目风险应对措施
上报	上报	规避
规避	开拓	开拓
转移	分享	转移或分享
减轻	提高	减轻或提高
接受	接受	接受

重点关注

1. 项目章程内容

（1）委派的项目经理及其职责与职权；

（2）发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权等；

（3）项目目的、可测量的项目目标和相关的成功标准；

（4）高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；

（5）整体项目风险、总体里程碑进度计划、预先批准的财务资源、关键干系人名单；

（6）项目审批要求、项目退出标准。

2. 变更流程

（1）变更申请

（2）对变更的初审

（3）变更方案论证

（4）变更审查

（5）发出通知并实施

（6）实施监控

（7）效果评估

（8）变更收尾

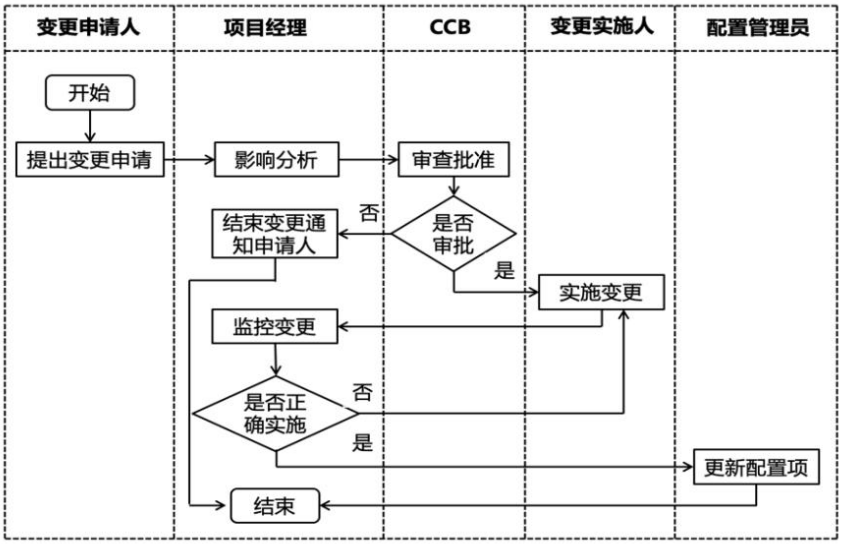

3.三个基准：内容、输出过程

	内容	输出过程
范围基准	已批准的项目范围说明书＋WBS＋WBS 词典	创建 WBS
进度基准	已批准的项目进度计划	制订进度计划
成本基准	经批准且按时间段分配的项目预算	制定预算

4.需求相关工具

（1）专家判断

（2）数据收集

工具名称	关键词
头脑风暴	产生多种创意的技术
访谈	直接交谈、正式或非正式、一对一、多对多、获取机密信息
焦点小组	预定的干系人和主题专家
问卷调查	受众多样化、受访者地理位置分散、统计分析方法
标杆对照	识别最佳实践、形成改进意见 标杆可以是内部或外部、同行业或不同行业

（3）数据分析

文件分析：审核和评估任何相关的文件信息。可供分析的文档很多，包括：协议；商业计划；业务流程或接口文档；业务规则库；现行流程；市场文献；问题日志；政策和程序、法规文件，如法律、准则、法令等；建议邀请书；用例等。

（4）决策

工具名称	关键词
投票	生成、归类和排序产品需求
独裁型决策制定	一个人负责为整个集体制定决策
多标准决策分析	借助决策矩阵，对众多创意进行评估和排序

（5）数据表现

亲和图：对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。

思维导图：用以反映创意之间的共性和差异，激发新创意。

（6）人际关系与团队技能

工具名称	关键词
名义小组技术	通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序
观察和交谈	不愿清晰说明需求，挖掘隐藏的需求
引导	引导与主题研讨会结合使用，把主要干系人召集在一起定义产品需求

（7）系统交互图

系统交互图：是对产品范围的可视化描绘，可以直观显示业务系统及其与人和其他系统之间的交互方式。

（8）原型法

原型法：是一种根据干系人初步需求，利用产品开发工具，快速地建立一个产品模型展示给干系人，在此基础上与干系人交流，最终实现干系人需求的产品快速开发的方法，减轻返工的风险。

5.质量相关工具

数据收集	数据分析	数据展现	其他
1.标杆对照 2.头脑风暴 3.访谈 4.核对单 5.核查表 6.统计抽样 7.问卷调查	1.成本效益分析 2.质量成本 3.备选方案分析 4.文件分析 5.过程分析 6.根本原因分析 7.绩效审查	1.流程图（过程图） 2.逻辑数据模型 3.矩阵图 4.思维导图 5.亲和图 6.因果图 7.直方图 8.散点图 9.控制图	1.专家判断 2.测试与检查的规划 3.会议 4.审计 5.面向 X 的设计 6.问题解决 7.质量改进方法 8.检查 9.测试/产品评估 10.多标准决策分析

6.进度计划类型

	里程碑进度计划	概括性的进度计划	详细进度计划
别称	里程碑图	横道图 （甘特图）	项目进度网络图 （纯逻辑图、时标网络图）
用途	标示出主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成日期	1.显示概括性活动 2.常用于向管理层汇报情况	优化展现活动之间的关系

7.成本估算、制定预算含义

（1）估算成本是对完成项目活动所需资金进行近似估算的过程。

✓ 项目估算的准确性随着项目的进展而增加

✓ 估算成本应该包括项目所有可能发生的成本

（2）制订预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

8.资源管理四个五

项目经理五种权力	团队发展五个阶段	马斯洛五个需求层次	冲突管理五种方法
职位权力	形成阶段	生理	撤退/回避
惩罚权力	震荡阶段	安全	缓和/包容
奖励权力	规范阶段	社会交往	妥协/调解
专家权力	发挥阶段	受尊重	强迫/命令
参照权力	解散阶段	自我实现	合作/解决问题

9. 权力/利益方格

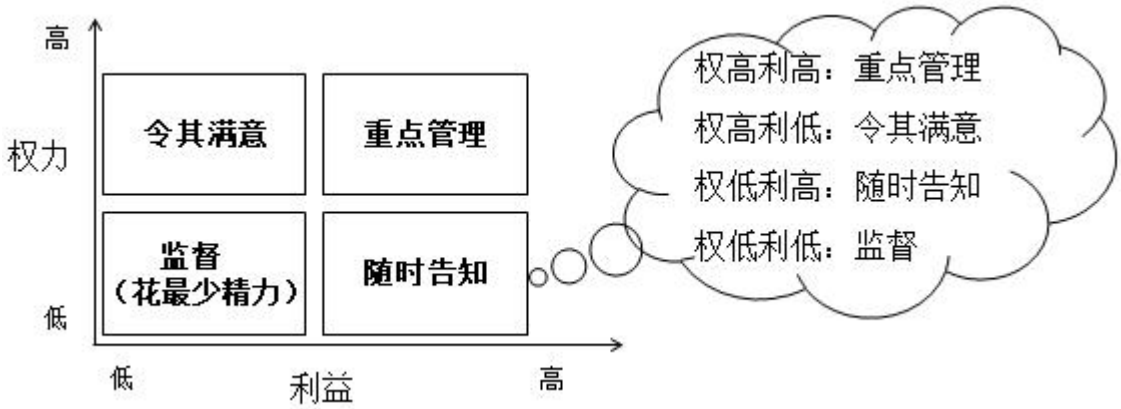

10. 沟通方法区别

沟通方法	含义	举例
互动沟通	在两方或多方之间进行多向信息交换	会议、电话、即时通信、社交媒体、视频会议
拉式沟通	信息量很大、受众很多、接收者自行访问	门户网站、组织内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库
推式沟通	把信息发送给特定的接收方	信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿

11. 定性风险工具

（1）数据收集：访谈

（2）数据分析：风险数据质量评估、风险概率和影响评估、其他风险参数评估

（3）风险分类

（4）数据表现：概率和影响矩阵、层级图

（5）人际关系与团队技能：引导

（6）专家判断

（7）会议

12. 规划采购、实施采购含义

（1）规划采购：记录项目采购决策、明确采购方法、识别潜在卖方的过程。

（2）实施采购：获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。

13. 合同类型

总价合同（卖方承担风险）：工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节。

成本补偿合同（买方承担风险）：工作范围尚不明确。

工料合同（双方承担风险）：工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同。

输入输出

1. 工作绩效数据、信息、报告相关输入输出

	输出	输入
工作绩效数据	指导与管理项目工作	除整合管理所有监控过程组
工作绩效信息	除整合管理所有监控过程组	监控项目工作
工作绩效报告	监控项目工作	实施整体变更控制、监督风险、管理团队/沟通

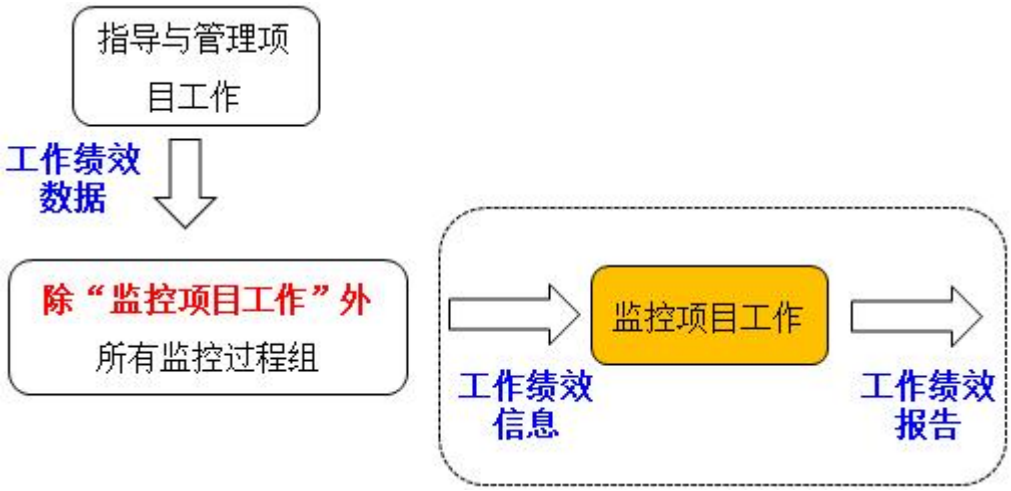

2.控制质量、确认范围输入输出
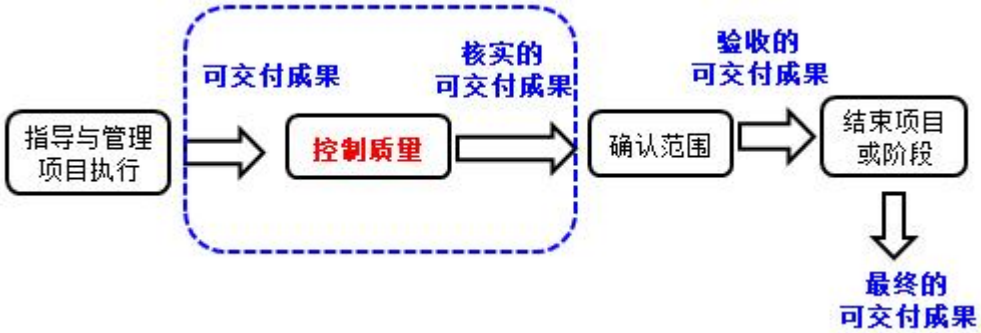
	输入	输出
控制质量	1.项目管理计划：质量管理计划 2.项目文件：质量测量指标、测试与评估文件、经验教训登记册 3.可交付成果 4.批准的变更请求 5.工作绩效数据 6.事业环境因素 7.组织过程资产	1.核实的可交付成果 2.质量控制测量结果 3.工作绩效信息 4.变更请求 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新
确认范围	1.项目管理计划：范围管理计划、需求管理计划、范围基准 2.项目文件：需求文件、需求跟踪矩阵、质量报告、经验教训登记册 3.工作绩效数据 4.核实的可交付成果	1.验收的可交付成果 2.变更请求 3.工作绩效信息 4.项目文件更新
