# 案例/论文专项答题技巧&思路

**【案例材料分析题】**

**1.题型**

**（1）选择**

**例子：**在候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸内。

通常来说，质量管理人员不应具备（　）的权限。

A、产品库代码的 Check 权限

B、产品库文档的 Check 权限

C、受控库代码的 Check 权限

D、受控库文档的 Check 权限

**（2）填空**

**例子：**_____：采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。

**（3）判断**

**例子：**制定项目管理计划采用从上到下的方法，先制定总体项目管理计划，再分解形成其他质量、进度等分项计划。（　）

**（4）简答**

**例子：**请写出项目章程的具体内容。

**（5）问答**

**例子：**结合以上案例，请指出本项目在项目风险管理中存在的问题。

**2.考查内容**

（1）管理知识性内容考查常以选择、填空、判断、简答形式。

**注意事项：**应对此类题需把基础知识掌握扎实

（2）找原因寻方法常以问答形式。

**注意事项：**

（1）从子过程出发寻找错误点

（2）以万金油方式去寻找错误点

（3）一定要结合材料进行回答

（4）分条分点解答问题

（5）逻辑清晰，运用管理语言

**3.知识性内容总结**

**【项目章程具体】**

（1）项目目的

（2）可测量的项目目标和相关的成功标准

（3）高层级需求、高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果

（4）整体项目风险

（5）总体里程碑进度计划

（6）预先批准的财务资源

（7）关键干系人名单

（8）项目审批要求

（9）项目退出标准

（10）委派的项目经理及其职责和职权

（11）发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

**【项目管理计划】**

十个管理计划：范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人参与计划

其他管理计划：变更管理计划、配置管理计划

三个基准：范围基准、进度基准、成本基准

其他：绩效测量基准、项目生命周期描述、开发方法

**【变更分类】**

纠正措施：为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动

预防措施：为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动

缺陷补救：为了修正不一致产品或产品组件，而进行的有目的的活动

更新：对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见和内容

**【变更流程】**

（1）变更申请

（2）对变更的初审

（3）变更方案论证

（4）变更审查

（5）发出通知并实施

（6）实施监控

（7）效果评估

（8）变更收尾

**【质量审计目标】**

（1）识别全部正在实施的良好及最佳实践；

（2）识别所有违规做法、差距及不足；

（3）分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；

（4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

（5）强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献等。

**【质量成本法】**

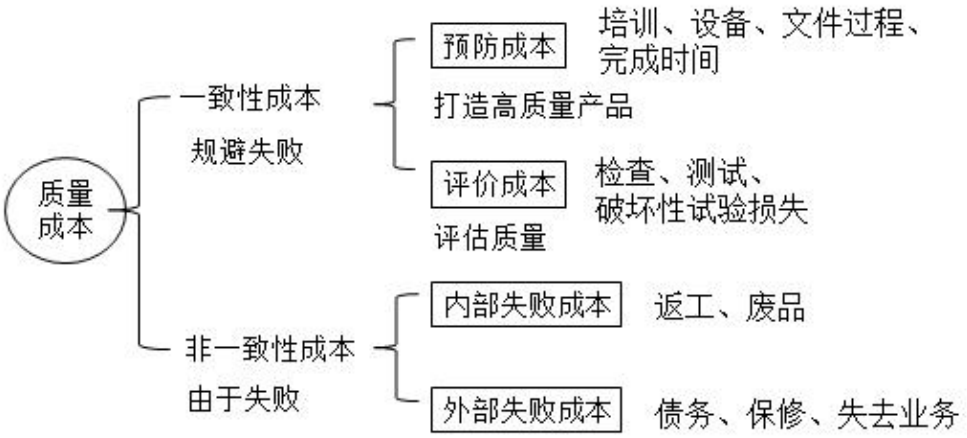


**【项目经理五种权力】**

（1）职位权力：来源于管理者在组织中的职位和职权；

（2）惩罚权力：使用降职、扣薪、惩罚、批评、威胁等负面手段的能力；

（3）奖励权力：给予下属奖励的能力；

（4）专家权力：来源于个人的专业技能；
（5）参照权力：由于成为别人学习参照榜样所拥有的力量。

**【团队发展阶段】**

（1）形成阶段：互相认识、互相独立，不一定开诚布公，开始有共同目标；
（2）震荡阶段：开始争执，互相指责，怀疑项目经理的能力；
（3）规范阶段：开始协同工作，开始互相信任；
（4）发挥阶段：组织有序，相互依靠，平稳高效地解决问题；
（5）解散阶段：项目结束，释放人员，团队解散。

**【马斯洛需求层次理论】**

| 层次 | 需求 | 举例 |
|---|---|---|
| **5. 自我实现** | 高 | 给他更多的空间让他负责、让他成为智囊团、参与决策、参与公司的管理会议等 |
| **4. 受尊重** | 低 | 荣誉性的奖励，形象、地位的提升，颁发奖章，作为导师培训别人等 |
| **3. 社会交往** | 低 | 定期员工活动、聚会、比赛、俱乐部等 |
| **2. 安全** | 低 | 养老保险、医疗保障、长期劳动合同、意外保险、失业保险等 |
| **1. 生理** | 低 | 员工宿舍、工作餐、工作服、班车、工资、补贴、奖金等 |

**【冲突管理】**

| 冲突管理 | 含义 |
|---|---|
| **撤退/回避** | 退出冲突，将问题推迟或推给别人 |
| **缓和/包容** | 也叫“求同存异”，强调一致性而非差异，考虑其他方面的需求 |
| **妥协/调解** | 各退一步，各方都在一定程度上满意 |
| **强迫/命令** | 推行一方的观点，利用权力来强行解决紧急问题 |
| **合作/解决问题** | 合作：集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案<br>解决问题：冲突各方积极行动，选择一个最合适的方案 |

**【成功团队的特征】**

（1）团队的目标明确 ，成员清楚自己工作对目标的贡献；
（2）团队的组织结构清晰，岗位明确；
（3）有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效；
（4）项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开，赏罚分明；
（5）有共同制定并遵守的组织纪律；
（6）团队成员相互信任，协同工作，善于总结和学习。

**【人力资源可以采取的措施】**

（1）采用合适的团队建设手段，消除团队成员间的隔阂；
（2）明确项目团队的目标及项目组各成员的分工；
（3）建立清晰的工作流程和沟通机制；
（4）建立明确的考核评价标准；
（5）鼓励团队成员之间建立参与和分享的氛围；
（6）制定有效的激励措施。

**【风险的分类】**

| 依据 | 分类 |
|---|---|
| 1. 按风险后果划分 | 纯粹风险、投机风险 |
| 2. 按风险来源划分 | 自然风险、人为风险 |
| 3. 按风险是否可管理划分 | 可管理的风险、不可管理的风险 |

| | |
|---|---|
| 4. 按风险影响范围划分 | 局部风险、总体风险 |
| 5. 按风险后果的承担者划分 | 项目业主风险、政府风险、承包商风险、投资方风险、设计单位风险、监理单位风险等 |
| 6. 按风险的可预测性划分 | 已知风险、可预测风险、不可预测风险 |

**【风险应对措施】**

| 威胁应对措施 | 机会应对措施 | 整体项目风险应对措施 |
|---|---|---|
| 上报 | 上报 | 规避 |
| 规避 | 开拓 | 开拓 |
| 转移 | 分享 | 转移或分享 |
| 减轻 | 提高 | 减轻或提高 |
| 接受 | 接受 | 接受 |

**【威胁的应对措施】**

| 威胁 | 内容 |
|---|---|
| 上报 | 如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取上报策略。威胁一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督 |
| 规避 | 采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响<br>如：消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围 |
| 转移 | 将应对威胁的责任转移给第三方<br>如：购买保险、使用履约保函、使用担保书和使用保证书 |
| 减轻 | 采取措施降低威胁发生的概率和影响<br>如：采用较简单的流程、更多测试、选用更可靠的卖方、原型和冗余 |
| 接受 | 承认威胁的存在，可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对威胁如应急储备 |

**【机会的应对措施】**

| 机会 | 内容 |
|---|---|
| 上报 | 某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采取上报策略 |
| 开拓 | 组织想确保把握住高优先级的机会<br>如：有能力的资源、全新技术或技术升级 |
| 分享 | 将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益<br>如：建立合伙关系、合作团队、特殊公司和合资公司分享会 |
| 提高 | 提高机会出现的概率和影响<br>如：为早日完成活动而增加资源 |
| 接受 | 承认机会的存在<br>如：预留时间、资金和资源 |

**【整体项目风险的应对措施】**

| 威胁 | 内容 |
|---|---|
| 规避 | 如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，应采取规避策略<br>如：取消项目范围中的高风险工作；如果无法将项目拉回临界值以内，则可能取消项目 |
| 开拓 | 如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采取开拓策略<br>如：在项目范围中增加了高收益的工作；与关键干系人协商修改项目的风险临界值 |

| | |
|---|---|
| 转移或分享 | 如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理 |
| 减轻或提高 | 变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性<br>如：重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等 |
| 接受 | 整体项目风险已超出商定的临界值，如无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展<br>如：建立整体应急储备 |

**【采购管理计划、采购策略和采购工作说明书】**

| 采购管理计划 | 采购策略 | 采购工作说明书 |
|---|---|---|
| 1. 采购工作将与其他项目工作协调和整合，特别是资源、进度计划和预算工作<br>2. 关键采购活动的时间表<br>3. 用于管理合同的采购指标<br>4. 所有干系人的职责<br>5. 采购假设和制约因素<br>6. 法律管辖和支付货币<br>7. 独立估算信息<br>8. 风险管理事项 | 1. 采购交付方法<br>2. 协议类型<br>3. 采购阶段 | 1. 采购项目描述<br>2. 规格、质量要求和绩效指标<br>3. 所需附加服务描述<br>4. 验收方法和验收标准<br>5. 绩效数据和其他所需报告质量<br>6. 履约时间和地点<br>7. 货币；支付进度计划<br>8. 担保 |

**【合同类型】**

（1）根据付款方式划分可将合同分为总价合同、成本补偿合同和工料合同。

（2）总价合同为既定产品或服务的采购设定一个总价。

（3）成本补偿合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。

（4）工料合同是指按项目工作所花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行付款。

**【合同类型的选择】**

总价合同（卖方承担风险）：工作范围很明确，且项目的设计已具备详细的细节

成本补偿合同（买方承担风险）：工作范围尚不明确

工料合同（双方承担风险）：工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同

**【合同索赔内容】**

| 合同索赔分类依据 | 索赔内容 |
|---|---|
| 按索赔的目的 | 工期索赔、费用索赔 |
| 按索赔的依据 | 合同规定的索赔、非合同规定的索赔 |
| 按索赔的业务性质 | 工程索赔、商务索赔 |
| 按索赔的处理方式 | 单项索赔、总索赔 |

**【合同索赔流程】**

（1）提出索赔要求

（2）报送索赔资料

（3）监理工程师答复

（4）监理工程师逾期答复后果

监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

（5）持续索赔

（6）仲裁与诉讼

**【权力/利益方格】**

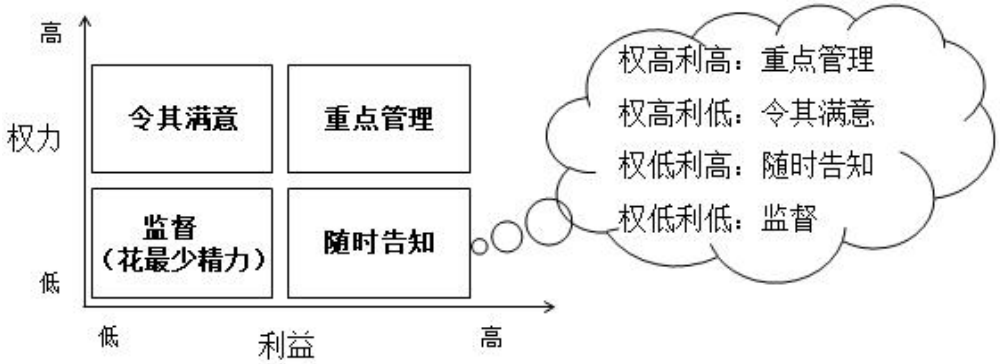


**4. 找原因寻方法万金油**

**（1）从人员方面思考**

①看到由**技术人员出身**做项目经理，需要给他培训；

②看到**身兼数职，没时间学习管理知识**；

③**有人对项目不满意，没有建立有效沟通机制**；

④看到**有争执**，就可以想到沟通问题，或者计划做的不够周到；只要是**与人有关的问题**，均可以找到沟通方面的答案；

⑤看到**多头汇报**的问题，就要想到项目经理权限的问题以及沟通、冲突等问题。

**（2）从流程方面思考**

①看到**新技术**，就要想到风险，接着就是应该对大家进行培训、学习；

②看到**变更**的方面，就一定是变更的三个要素：书面申请、审批和确认、跟踪变更过程；

③看到**经过了多久，发现项目有问题**，就可以说是监控不力；

④看到**里程碑或一些时间安排的很紧张**，就说明没有考虑到冗余的思想；

⑤看到**因为外部的因素导致项目的延工**等，就要想到可能影响变更的原因，或者沟通不力，干系人管理不好。

**（万能框架推荐，但不绝对；看题目要求，灵活应对！）**

**5. 历年真题（重在看答题关键点、角度以及语言）**

**【2021 年 11 月·高级·试题一】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

某集团公司希望对总部现有信息系统进行升级改造，升级后的系统能收集整合子公司各类数据，实现总部对全集团人力资源、采购、销售信息的掌握、分析及预测。

小王担任项目经理，项目交付期为 60 天。小王研究了总部提出的需求后，认为项目核心在于各子公司数据收集以及数据可视化及分析预测功能。各子公司数据收集可以以总部现有系统中的数据格式模板为基础，为各子公司建立数据上传接口。针对数据的分析预测功能，由于牵涉到人工智能等相关算法。目前项目组还不具备相关方面的知识储备，因此项目组对该模块功能直接外包。小王将数据收集与可视化工作进行了 WBS 分解，WNS 的部分内容如下：

| 工作编号 | 工作任务 | 工期 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| 2 | 系统设计 | 20 天 | 王工 |
| 3 | 程序编制 | 30 天 | 任工 |
| … | … | … | … |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | 人力资源模块编码 | 25 天 | 孙工 |
| 3.2.2 | 采购模块编码 | 20 天 | 赵工 |
| 3.2.3 | 销售模块编码 | 20 天 | 赵工 |
| … | … | … | … |
| 4 | 系统测试与验收 | 5 天 | 张工、李工 |
| … | … | … | … |

此外，虽然总部没有提出修改界面，但小王认为旧版的软件界面不够美观，让软件研发团队重新设计并更改了软件界面。

试运行阶段，总部人员试用后，认为已经熟悉旧版的操作模式，对新版界面的布局极其不适应；各子公司数据报送人员，认为数据上报的字段内容与自己公司的业务并不相关，填写困难。总部和各子公司的试用人员大部分认为新系统不是很好用。

【问题 1】(12 分)

(1) 请结合案例，简要分析该项目经理在 WBS 分解中存在的问题。

(2) 写出 WBS 分解时，需要注意的事项。

【解析】(1) 项目经理在 WBS 分解中存在的问题:

①WBS 的分解不应由小王一个人负责，应邀请项目所有团队成员及所有（主要）干系人参与;

②未对项目可交付成果进行全面识别和分析;

③WBS 组件有多人负责;

④WBS 不符合 8/80 原则;

⑤WBS 没有包括管理工作;

⑥WBS 没有包括分包出去的工作;

⑦WBS 分解完成后未经项目干系人一致确认。

(2) WBS 分解注意事项:

①WBS 必须是面向可交付成果的;

②WBS 必须符合项目的范围;

③WBS 的底层应该支持计划和控制;

④WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与;

⑤WBS 的指导，作为指导而不是原则，WBS 应控制在 4～6 层;

⑥WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作;

⑦WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与;

⑧WBS 并非是一成不变的。

【问题 2】(8 分)

请结合案例，除 WBS 分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。

【解析】项目在范围管理中还存在的问题:

(1) 未制定项目范围管理计划;

(2) 未全面收集客户需求;

(3) 未对需求进行跟踪;

(4) 范围定义存在问题，未形成范围说明书;

(5) 未进行范围确认;

(6) 范围控制存在问题，变更未走管理流程;

(7) 未与干系人进行良好沟通;

(8) 存在范围蔓延的风险。

**【2021 年 11 月·高级·试题三】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员。小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码做一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题 1】(10 分)

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【解析】项目在配置管理方面存在的问题:

(1) 小杨不能负责项目质量的同时担任配置管理员;

(2) 小杨不能直接编写和发布质量管理计划;

(3) 小杨不能给小王开放所有的配置权限;

(4) 小杨不能直接决定是否批准变更请求;

(5) 小杨不能删除旧的代码。

**【2022 年 5 月·高级·试题一】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

A 公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型。A 公司承诺免费提供一个智慧社区 APP 小程序，并将其写入项目合同中，合同期为 6 个月。

项目经理小邱负责 APP 的开发，项目周期 4 个月，计划 2019 年 12 月上线。因合同中没有对 APP 给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了 APP 的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区网发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了 APP 的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019 年 7 月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字。

后期，项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019 年 12 月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该 APP 进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

**【问题 1】(10 分)**

(1) 结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏？如有，请指出遗漏的内容。

(2) 请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

| | 范围确认和质量控制的不同之处 |
|---|---|
| 检查内容 | |

| | |
|---|---|
| 检查的时间点 | |
| 执行人员 | |
| 详略程度 | |

**【解析】**

（1）有遗漏；

①没有对可交付成果进行确认；

②没有对质量标准进行确认；

③没有对审核和承诺有清晰的表达确认；

④没有对项目范围风险进行确认；

⑤没有对项目范围是否覆盖了需要完成产品或服务进行的所有活动进行确认。

（2）检查内容：确认范围主要强调可交付成果获得客户或发起人的接受；质量控制强调可交付成果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求（质量标准）。

检查时间点：质量控制一般在确认范围前进行，也可同时进行；确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制并不一定在阶段末进行。

执行人员：质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施；确认范围则是由外部干系人（客户或发起人）对项目可交付成果进行检查验收。

详略程度：核实产品、确认范围和质量控制是递进的、越来越细的检查过程。

**【2022 年 5 月·高级·试题三】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

A 公司承接某市机关事业单位养老保险信息系统，项目覆盖整个市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组，并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如下图所示：

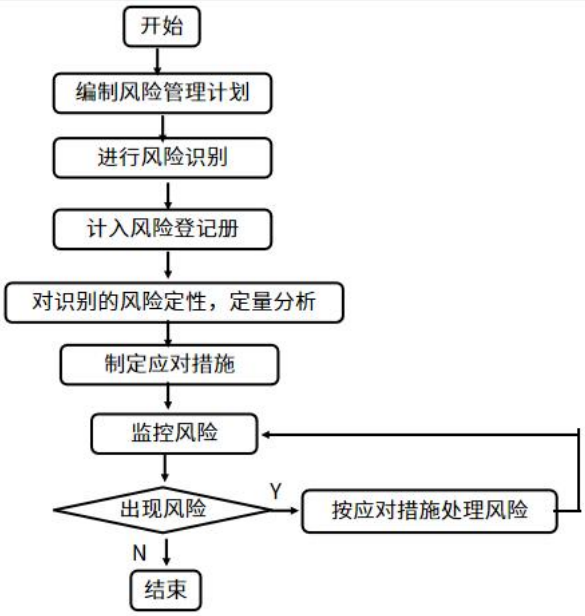


项目组对风险登记册中的各风险制定了相应措施，部分措施如下所示：

| 风险类别 | 风险描述 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 人员风险 | 人员情绪风险 | 调离项目组 |
| 技术风险 | 缺少数据库设计和相关技术储备 | 外包 |
| 技术风险 | 需要新的数据安全管理技术 | 培训 |
| 管理风险 | 非预期事件造成成本增加的风险 | 应急储备 |
| 管理风险 | 审批流程繁琐 | 加强部门沟通，建立协调配合机制 |

此外，在信息安全方面，养老保险数据信息涉及个人隐私，如果不法分子突破安全限制，会造成用户隐私泄露或信息篡改。因此项目组采用 PKI 技术为系统的安全运行提供了有效的保障。

**【问题 1】(4 分)**

请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

**【解析】**

(1) 出现风险后应该从风险识别开始，识别是否有新风险出现。

(2) 对识别的风险管理这一步应该在对识别的风险定性、定量分析之后进行。

(3) 出现风险后需要重新更新风险应对措施。

(4) 出现风险后需要对风险进行再评估、风险审计，还需要对项目风险实际结果和风险应对策略的实际结果进行比较。

(5) 出现新风险后可能会对进度、成本造成影响，该流程未考虑。

**【2022 年 11 月·高级·试题一】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

某集团为提升企业服务水平和办公效率，通过招投标选定 A 公司为其开发企业协同办公管理信息系统。A 公司组建了项目团队，任命小张担任项目经理，并将系统中的数据可视化模块外包给某一软件公司。

在制定项目管理计划过程中，小张让负责研发的小陈制定沟通管理计划，作为项目管理计划的子计划。小陈认为编制沟通管理计划是一件重复性的工作，于是参考过去的项目管理计划，简单进行了修改后放入了项目计划文件夹下作为公共信息供大家查阅，完成后的沟通管理计划表如下:

| 沟通内容 | 沟通方法 | 沟通时间 | 参与人 | 沟通目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每周工作例会 | 谈话 | 每周五 16:00 | A 公司项目组成员 | 汇报进度,解决遇到问题 |
| 方案评审 | 会议 | 阶段性 | A 公司项目组相关成员 | 确定方案 |
| 项目阶段性总结 | 电子邮件 | 里程碑 | A 公司主管领导、项目 | 阶段性汇报 |
| 软件开发技能培训 | 在线课程 | 临时 | A 公司软件研发人员 | 提高软件研发技能 |
| 项目交流会 | 电话 | 项目启动、结束时 | A 公司项目组成员，客户外包公司 | 各方了解项目情况 |

每次参加客户召集的项目沟通会，小张会根据项目组人员空闲时间临时安排参会人员。参会人员不固定，新的参会人员对之前会议需要确认的内容毫不知情，这种情况时有发生。引起客户强烈不满，沟通不好，效率也不高。

在项目进行中，客户对数据可视化模块要求增加了新功能。经变更确认后，小张电话通知外包公司增加。新功能项目验收时发现新功能并未实现。

**【问题 1】（6 分）**

指出小陈制定的沟通管理计划表当中已列出内容的不合理之处。

**【解析】**

（1）每周例会应该采取会议的形式进行沟通。

（2）方案评审会议没有通知相关领导与客户等重要干系人，参与人员应该还包括客户、外包公司、领导等干系人。

（3）开发技能培训应该要明确培训时间。

（4）项目交流会应该采用会议形式。

（5）项目启动应召开项目启动会议，而不是项目交流会。

（6）项目结束的时候应召开项目总结会议。

**【问题 2】（10 分）**

在下表中补充沟通管理过程并写出该项目在沟通管理各过程上存在的问题。

| 沟通管理过程 | 存在问题 |
|---|---|
| 过程 1：规划沟通 | |
| 过程 2： | |
| 过程 3：控制沟通 | |

**【解析】**

| 沟通管理过程 | 存在的问题 |
|---|---|
| 规划沟通 | （1）项目经理对规划沟通管理工作重视程度不够。<br>（2）不应该由负责研发的小陈制定沟通管理计划，工作安排不合理，用人不当。<br>（3）制定沟通管理计划未结合项目实际情况，只参考了以往的计划，进行简单修改。<br>（4）沟通管理计划不够详细，不够完善，部分沟通方法错误，参与人不全。<br>（5）制定沟通管理计划后没有经过评审。 |
| 管理沟通 | （1）项目沟通会不应该由客户召集。<br>（2）会议应该要定时召开，案例中没有明确开会时间。<br>（3）每次开会，不应该临时安排参会人员，应提前通知安排。<br>（4）应该明确沟通人员，不应随时变动参会人员。<br>（5）召开会议前，应提前准备会议议题。<br>（6）沟通应当注重效率。<br>（7）未能及时与客户沟通，引起客户不满。<br>（8）针对沟通存在的问题，未及时处理，导致经常发生同样的问题。 |
| 控制沟通 | （1）沟通结果未能形成相关记录文件。<br>（2）变更通知仅通过电话告知，未开展正式的书面流转。<br>（3）未对沟通结果进行监控。 |

**【2022 年 11 月·高级·试题三】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

A 公司为提升市场竞争力，计划针对制造业数字化转型的需求，新开发一套数字化软件，实现在工业产品生产和制造过程中数据采集，分析和决策功能。公司让产品部前期对市场需求进行调研。产品部对软件预期能产生的经济效益和社会效益，进行了详细的分析，并针对这两部分，编制了《可行性分析报告》。公司高层领导看了报告后，认为该软件未来会为公司带来巨大的收益，当场拍板决定启动项目，要求产品部补充编制《项目建议书》，并组建项目团队。

小王作为某名校计算机专业刚毕业的研究生，被公司委以重任，担任该项目的项目经理。研发负责人向小王建议为配置管理设置一名专职配置管理员，但小王认为有配置管理工具对代码进行控制，大家只要对程序代码做好版本控制就可以了，考虑到项目组人员紧张，没必要再安排专人负责配置管理工作。

开发过程中，为避免多人同时修改代码导致冲突，研发人员要先将服务器上的代码下载，待编码完成后，使用文本对比工具将代码中修改的部分进行上传整合。

软件研发完成测试通过后，研发人员将最终版本软件和软件使用说明书提供给产品部，产品部人员发现说明书描述和内容与软件不完全一致，于是将问题反馈给小王，小王经检查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

**【问题 1】（12 分）**

请结合案例，分析项目在可行性研究和配置管理中存在哪些问题。

**【解析】**

可行性研究方面:

1.未形成项目建议书，缺少可行性研究的依据。

2.可行性研究缺少机会可行性研究和初步可行性研究。

3.可行性研究内容不够全面，产品部仅对软件预期能产生的经济效益和社会效益进行研究，还应该包括技术可行性、运行环境可行性以及法律可行性等进行研究。

4.缺少项目论证和评估环节，先论证后决策是现代项目管理的基本原则，项目没有经过论证，公司高层直接拍板启动项目。

配置管理方面:

1.项目经理小王欠缺项目管理和配置管理的经验。

2.没有设置专职的配置管理员。

3.没有制定一套完整配置管理计划，并按计划实施。

4.没有建立有效的统一规范的配置项管理制度。研发人先将代码下载，使用文本对比工具将修改部分上传整合，进度缓慢。

5.没有进行有效的配置审计，出现说明书描述和内容与软件不完全一致的情况。

6.版本管理混乱，查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

**【2021 年 11 月·中级·试题一】**

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

A 公司承接了某信息系统建设项目，任命小张为项目经理在项目启动阶段，小张编制了风险管理计划，组织召开项目成员会议对项目风险进行了识别并编制了项目风险清单。随后，小张根据自己多年的项目实

施经验，将项目所有的风险按照时间先后顺序制定了风险应对计划，并亲自负责各项应对措施的执行。风险及应对措施的部分内容如下：

风险 1：系统上线后运行不稳定或停机造成业务长时间中断

应对措施 1：系统试运行前开展全面测试。

应对措施 2：成立应急管理小组，制定应急预案。

风险 2：项目中期人手出现短期不足造成项目延期。

应对措施 3：提前从公司其它部门协调人员。

风险 3：设备到货发生损坏，影响项目进度。

应对措施 4：购买高额保险。

风险 4：人员技能不足。

应对措施 5：提前安排人员参加原厂技术培训。

项目实施过程中，公司相关部门反馈，设备发生损坏的概率低，建议降低保额；原厂培训价格过高，建议改为非原厂培训。小张坚持原计划没有进行调整。系统上线后发生故障停机，由于缺少应急预案造成业务长时间中断，公司高层转达了客户的投诉，也表达了对项目成本管理的不满。

**【问题 1】（10 分）**

结合案例，请指出小张在项目风险管理各个过程中存在的问题。

**【解析】**

（1）风险管理计划的编制要全员参与；

（2）识别风险没有全员参与；

（3）没有定性风险分析过程；

（4）没有定量风险分析工程；

（5）风险应对计划也需要相关干系人共同参与制定，风险应对计划制定顺序是根据风险分析的结果来制定的；

（6）没有做好风险控制；

（7）没有制定应急预案；

（8）自己负责各项应对措施不妥，各风险应对措施的实施应责任分配到人。

**【2021 年 11 月·中级·试题四】**

阅读下列说明，回各问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

**【说明】**

A 公司承接了某金融行业用户（甲方）信息系统建设项目，服务内容涉及咨询、开发、集成、运维等。公司任命技术经验丰富的张伟担任项目经理，张伟协调咨询部、研发部、集成部、运维部等部门负责人抽调相关人员加入项目组。考虑到该项目涉及甲方单位多个部门，为使沟通简便、高效，张伟编制了干系人清单，包括甲方各层级管理人员及技术人员、公司高层人员以及项目组成员。同时，计划采用电子邮件方式，每周群发周报给所有项目干系人。周报内容涵盖每周工作内容、项目进度情况、质量情况、问题/困难、需要甲方单位配合及决策的各类事宜等。

在项目团队内部，采用项目例会的方式进行沟通。项目实施过程中，个别项目成员联系张伟，希望能单独沟通个人发展及工作安排问题，张伟建议将问题在月度例会上提出。在月度例会上，部分项目成员抱怨自己承担的项目工作经常与所在部门年初制定的培训工作及团队建设活动冲突，对个人发展不利。为了避免造成负面影响，张伟制止了这些项目成员的发言。之后，张伟向公司高层抱怨相关部门的培训团建等工作总与项目安排有冲突，建议相关部门作出调整。高层不认可张伟的说法，建议张伟加强项目的沟通管理。

**【问题 2】（7 分）**

请指出张伟沟通管理中存在的问题。

【解析】

(1) 未编制沟通管理计划;

(2) 编制干系人清单应全员参与;

(3) 识别干系人不全面，部分人员未及时开展有效沟通;

(4) 干系人沟通方式单一，只采用电子邮件方式;

(5) 对于员工的诉求，应私下解决问题，不应在大会上公开说，需采用非正式沟通手段;

(6) 控制沟通不力，采取强迫手段中止张伟的诉求，导致后续的冲突升级;

(7) 与高层沟通不力，未得到高层领导的认同。

【2022 年 5 月·中级·试题三】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司开发一套信息管理系统，指定小王担任项目经理。由于项目工期紧张且数据库开发工作任务量大，小王紧急招聘了两名在校生兼职负责数据库开发工作。项目需求确定后，公司根据疫情防控要求采用居家方式办公。小王认为居家办公更强调团队成员的个人责任，让团队成员自行决策相关事宜，原定的技术交流、项目例会暂时取消。

疫情好转，公司正常办公后，小王召集团队成员开项目会议，发现项目的实际执行情况远远落后于预期进度，团队成员对需求的理解有许多不一致的地方，且数据库的设计不符合公司设计规范要求。团队成员反馈，需求文档中行业术语太多难以理解、相关规范性文件无处查询且居家办公效率太低。

为赶进度，小王要求项目组全体人员加班赶工，引发部分员工不满。老张认为已经按时完成任务，加班对自己不公平，坚决不加班，引起项目组其他人员的不满，与老张在例会上直接发生了争执，因老张为核心人员，小王默许老张的这种行为。

【问题 1】(6 分)

结合案例，请指出小王在人力资源管理方面存在的问题。

【解析】

(1) 未制定人力资源管理计划;

(2) 组建团队出现问题，没有招募合适的项目成员;

(3) 管理团队出现问题，没有进行良好的冲突管理;

(4) 目标不明确，没有制定共同遵守的规则;

(5) 采取了虚拟团队但没有进行有效的沟通，导致居家办公效率太低;

(6) 建设团队有问题，没有及时组织有效的团队建设活动，造成绩效落后;

(7) 在成员上岗前未进行良好的培训，导致团队成员对需求的理解有许多不一致的地方;

(8) 项目经理缺乏项目管理能力和经验。

【2022 年 11 月·中级·试题三】

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某小区进行物业服务提升，拟上线物业管理系统。该系统包括门禁管理、停车管理、维修服务管理收费管理等核心功能及业主论坛等其他功能。物业公司准备通过公开招标的方式采购该系统，并且发布了招标公告。

信息服务公司 A 得知招标信息后，找到物业公司的负责人，详细介绍了公司的业务背景，提出可以为物业公司定制系统，完全按照物业公司的需求范围和时间要求来完成，并承诺提供终身免费维护。物业公司与 A 公司提前签了意向合同，不过流程仍按照招投标来走，A 公司和物业公司一起准备了一份投标书。

最终物业公司共收到三家公司的投标书，物业公司将开标和评审安排在同一天，评审工作由 A 公司协助物业公司来完成。物业公司和 A 公司一起针对其他两家公司投标材料进行了评审，计划借鉴其他两家公司方案，并宣布 A 公司中标，2 个月后物业公司和 A 公司签订了合同。

项目实施的过程中，公司将门禁管理系统和停车管理系统分包给另外一家专门做门禁和停车管理系统的公司来实施。

**【问题 1】（9 分）**

请指出本案例中招投标过程中存在的问题。

**【解析】**

（1）物业公司与 A 公司提前签了意向合同不妥，属于招标人与投标人串通投标，违背了公平的原则；

（2）A 公司和物业公司一起准备了一份投标书不妥，物业公司不能参与投标书制定；

（3）评审工作由 A 公司协助物业公司来完成不妥，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（4）A 公司计划借鉴其他两家公司方案不妥，招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

（5）2 个月后物业公司和 A 公司鉴订了合同不妥，合同签订期限：在投标有效期内及发出中标通知书之日起 30 日内。

（6）A 公司将门禁管理系统和停车管理系统进行分包不妥，不得分包主体、关键工程。

**【论文框架】**

**一、管理过程为框架（万能）**

背景介绍　600字

论文主体　1500字

一、管理过程一

……

二、管理过程二

……

三、管理过程三

……

结尾　300字

◆ **背景介绍**

1. 项目背景部分的内容几乎通用，准备一个项目，对应所有主题
2. 背景部分，注意关键要素：

✓ 背景 600 字左右

✓ 一定要有背景八大件

✓ 一定要有“我作为项目经理”

✓ 一定要重点进行了 XX 管理，根据题意写；如果是两个管理，要把两个管理都写出来

◆ **论文主体**

1. 以管理过程为框架

2. 论文子题目，**可以拎出来一段重点写**

◆ **结尾**

1. 300 字左右
2. 总结问题，写心得体会

**（万能框架推荐，但不绝对；看题目要求，灵活应对！）**
